



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS  
RECTORIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2012-2018

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
08 de febrero de 2013

**Oficio No. R-0013/2013**

DR. FERNANDO SALMERÓN CASTRO  
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA SEP  
P R E S E N T E

11 FEB 2013  
11:50 AM

Con relación a la solicitud de los informes del proyecto "Tercera etapa del Plan Rector de Construcción (conclusión: Centro Universitario de Información y Documentación, techado de andadores y Unidades Académicas Multidisciplinarias)" autorizado en el marco del Fondo Extraordinarios de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales, inmerso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y con base a los Lineamientos de operación emitidos por la Secretaría de Educación Pública, anexo al presente envío a usted, impreso y en archivos electrónicos, el informe al cuarto trimestre (final) de 2012.

Asimismo, le comunico que si bien los recursos son autorizados a la Universidad, son ejecutados por el organismo constructor de escuelas del Estado, como lo señala el convenio de apoyo financiero correspondiente, la Universidad proporciona el seguimiento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JAVIER ALVAREZ RAMOS  
RECTOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
CGEIB

RECIBIDO  
08 FEB 2013  
COORDINACIÓN  
GENERAL



- C.c.p. Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda.- Director General del INIFECH.
- C.c.p Mtra. Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media y Superior CGEIB.
- C.c.p Ing. Rigoberto Ríos Jiménez.- Coordinador de Planeación de la UNICH.
- C.c.p. Archivo

CHIAPAS NOS UNE

Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra,  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx  
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51  
63 161 52  
63 148 88  
63 148 88  
Ext. 110



COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE

Dirección de Educación Media Superior y Superior



*Fondo de Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes  
(Fondo de concurso, incluye equipamiento) 2010*

*Universidad Intercultural de Chiapas*

### **INFORME FINAL**

#### **1. Información general del proyecto**

**Nombre:**

- Tercera etapa del Plan Rector de Construcción (conclusión: Centro Universitario de Información y Documentación, techado de andadores y Unidades Académicas Multidisciplinarias)

**Objetivo general:**

Proporcionar espacios adecuados para el proceso de educativo y de generación del conocimiento a la comunidad universitaria acorde al modelo educativo intercultural y oferta académica actual y futura de la Universidad

**Objetivos específicos:**

- Proporcionar espacios adecuados para la operación de los programas educativos

**Metas:**

- M.1 Terminación de la construcción del Centro Universitario de Información y Documentación para la atención de 3,000 estudiantes
- M.2 Terminación de la construcción la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas
- M.3 Terminación de la construcción la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón
- M.4 Terminación del techado de los andadores de la Unidad Central

**Indicadores:**

- Atención a la matrícula de estudiantes

**Recurso asignado:**

- \$21'346,922.00

#### **2. Informe Técnico de Avances**

**Tiempo de duración: Inicio y final**

- 01/05/2010 al 31/12/2010

**Ejercicio del recurso asignado:**

77

• 2010

**Avances físicos:**

- Determinación y envío de los requerimientos institucionales de construcción y equipamiento por parte de la UNICH
- Conclusión de la elaboración del proyecto ejecutivo
- Autorización del proyecto ejecutivo por parte del INIFED.
- Realización del estudio de mecánica de suelos.
- La obra presenta un avance Centro Universitario de Información y Documentación presenta un avance del 100% con respecto de los recursos autorizados.
- La primera etapa de la Unidad Académica Las Margaritas se concluyó y fue inaugurada el día 21 de agosto, la obra exterior se concluyó en enero de 2013.
- La Unidad Académica Yajalón en su primera etapa se concluyó en enero de 2013 con respecto de los recursos autorizados.
- La obra del techado presenta un avance del 100%.

**Nota:** La obra de la primera etapa de la Unidad Académica Yajalón se concluyó en enero de 2013, el complemento de los recursos fueron autorizados en el FAI 2011 y fondos estatales.

**3. Impacto esperado al finalizar el proyecto**

**Número de estudiantes beneficiados con el desarrollo del proyecto:**

- 1,679 estudiantes matriculados

**Actores de la comunidad universitaria beneficiada con el desarrollo del proyecto:**

- Estudiantes matriculados en la Universidad.

**Comunidades y/o municipios beneficiados con el desarrollo del proyecto:**

- San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Yajalón, Oxchuc y Salto de Agua

**Nivel de importancia para la Universidad Intercultural de Chiapas y para las comunidades del entorno sobre la conclusión del proyecto:**

- Proporcionar servicios de información y documentación a 1,679 estudiantes matriculados en las cinco sedes de la Universidad y al público en general


**Beneficios que se generan a mediano y largo plazo a través del desarrollo del proyecto:**

- Ampliación de la cobertura de los servicios institucionales de la Universidad


- Dotar espacios adecuados para la operación de los programas educativos y de generación y aplicación del conocimiento.
- Atender los indicadores de los organismos evaluadores para la evaluación externa de los programas educativos

**Observaciones:**

- Los recursos autorizados en la aportación estatal fueron liberados en el mes de diciembre de 2010 por la Secretaría de Hacienda del Estado.
- Los recursos federales fueron depositados por la Secretaría de Hacienda en el mes de marzo de 2011 al organismo constructor de escuelas.
- El convenio fue enviado por la CGEIB para su validación en el mes de Octubre de 2010.
- La aportación federal ya fue ejercida, la aportación estatal fue liberada en diciembre de 2011, después de realizar trámites de refrendo fue depositada en noviembre de 2012 al INIFECH.



ING. RIGOBERTO RIOS JIMENEZ  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN  
Elaboró



MTRO. JAVIER ALVAREZ RAMOS  
RECTOR  
Vistó Bueno

# Obras en proceso



Centro Investigativo de Información y Documentación  
(C.I.D.)

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

\$37'987,134.00

Avance de 98%

Enero 2013

Descripción

Ubicación

Recurso: Anticipo por honorarios  
Extracurriculares

Estado

Fecha de entrega

Unidad Académica Multidisciplinaria  
Las Margaritas




377

# Obras en proceso:



Obra:	Primera etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón
Ubicación:	Yajalón, Chiapas
Recursos autorizados por Fondos Extraordinarios:	\$22'604,000.00
Estatus:	Avance del 100%
Fecha de entrega:	enero de 2013

# Obras:

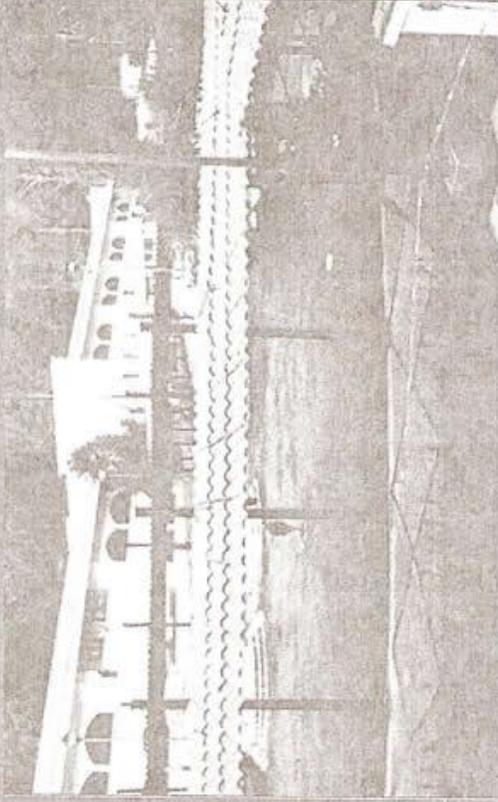

Descripción:	Techado de andadores
Ubicación:	San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Inversión:	\$3'040,000.00
Estatus:	Avance 100%
Fecha de entrega:	Diciembre 2012
