

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
 10 JUL 2019
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO
09 JUL 2019

OFICIAÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

RECIBIDO
09 JUL 2019
PER 15:12

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas Igualitario y plural
Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de julio de 2019

Oficio No. UNICH/CP/044/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de junio.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de junio, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	junio 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
08 JUL 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
- 9 JUL. 2019
Recibe: [Handwritten initials]
Secretaria Técnica de la Oficina de la C. Secretaria
RECIBIDO - PLANTA BAJA

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento
- C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Angeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

S.E.P. 12:22
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
18 JUL 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Sin anexos
18 JUL 2019
RECIBIDO
COPIAS DE CONOCIMIENTO

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. (967) 63 161 52, 63
148 86, 63 148 88, Ext. 110, 132 y 145 www.unich.edu.mx

UNICH-SGC-F-03
Rev. 02/2019/02/01

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

Junio

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSUC098J

RESPONSABLES

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Asesorías y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera etapa).	X				\$ 996,798.85	\$ 996,798.85	-\$ 0.00		168m2		La empresa constructora se encuentra colocando la estructura metálica, esperando que quede colocada en su totalidad a finales del mes de julio.	Así mismo, comenzarán la segunda etapa para el mes de agosto con la finalidad de concluir al 100% la obra con recursos del FAM 2018 y FAM 2019.	75%	24/12/18	31/07/19	Con el recurso otorgado por parte de FAM 2018 no se logró la culminación de la obra, por lo que se gestionó el recurso con el programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, siendo como resultado aprobado para la terminación de la obra. INIFECH renombra 1 etapa conforme al contrato de obra 189160-0304, como responsable de la construcción de la obra Aldrin Gomez Lazaro, en su caracter de persona física.							
									TOTAL	0	0.00													
									TOTAL	0	0.00													
						\$996,798.85	\$996,798.85	\$0.00																

(Handwritten signature)
Dr. Jorge Luis Zuñiga Macías
Titular de la IES

(Handwritten signature)
C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anexas tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

PRIORIDAD 2



Nombre de la obra: **Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**



Porcentaje de avance

65%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

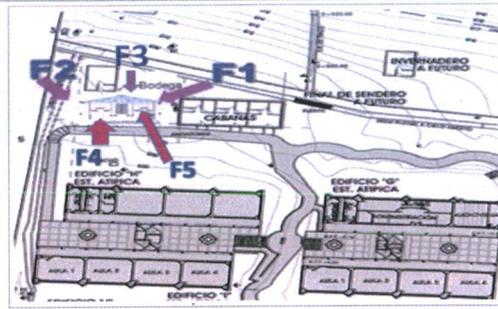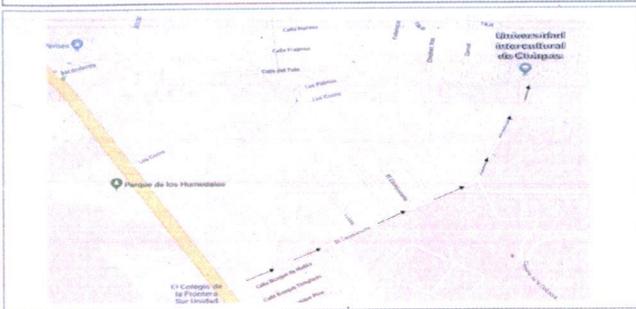

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

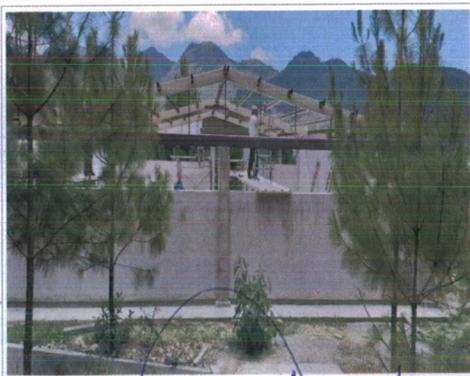

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

La empresa constructora se encuentra colocando la estructura metálica, esperando que quedé colocada en su totalidad a finales del mes de julio.

Así mismo, comenzaran la segunda etapa para el mes de agosto con la finalidad de concluir al 100% la obra.

En atención a su Oficio No. 211-3/2019.-0639, informo a usted que con el recurso otorgado del FAM 2018 no se logró la culminación de la obra debido a que no ajusto el recurso, por lo que la obra se terminara con recursos del FAM 2019.

Dr. Jorge Luis Zuat Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
