



**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
07 de junio de 2019**

**Oficio No. UNICH/CP/040/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de mayo.**

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de mayo, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Mayo 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación



- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

Mayo

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0096J

RESPONSABLES

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de conservación	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional		X			\$ 996,798.85	\$ 996,798.85	-\$ 0.00			168m2	Se realizó la pavimentación del interior de la bodega, se repello para cubrir muros y columnas, así como se construyeron gradas para el acceso a la bodega, en los siguientes días colocaran la estructura metálica para el techado y con eso concluir con la Primera Etapa.	Esta pendiente la colocación de la estructura metálica y las láminas de teja por parte de la empresa constructora.	65%	24/12/18	31/07/19	Con el recurso otorgado por parte de FAM 2018 no se logro la culminación de la obra, por lo que se gestionó el recurso con el programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, siendo como resultado aprobado para la terminación de la obra. Se cambia la fecha de termino ya que la empresa aún no cuenta con la estructura, por lo que esta Casa de Estudios solicitara a INIFECH agilizar la terminación de la obra al 100%.						
TOTAL										0	0.00												
TOTAL						\$996,798.85	\$996,798.85	\$0.00															

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar fotos cuando sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismo caso se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en los dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2

Nombre de la obra:



Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional



Porcentaje de avance

65%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

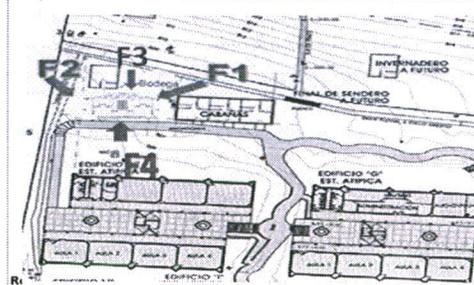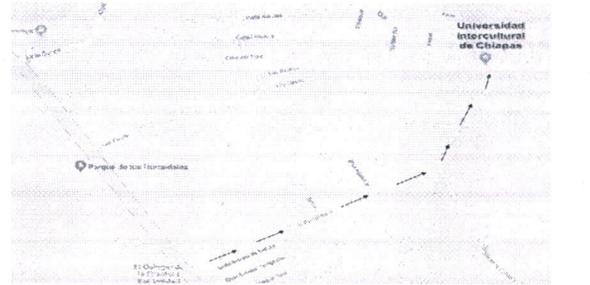


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS

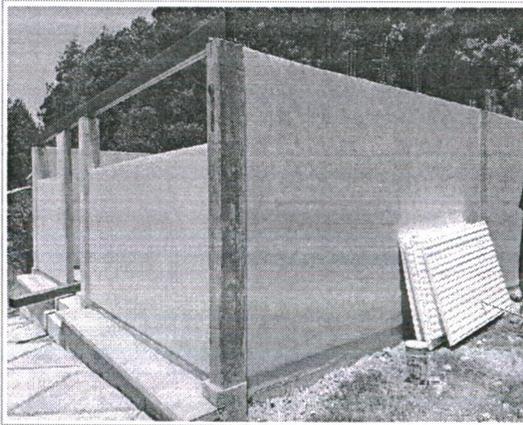


F1: Fachada principal

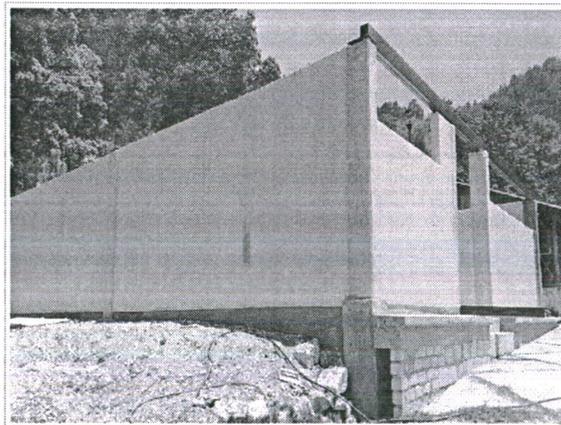

F2: lateral

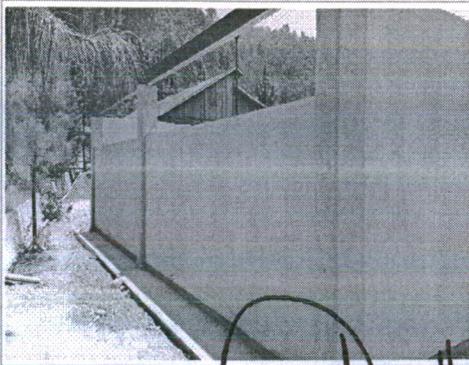

F3: Fachada posterior

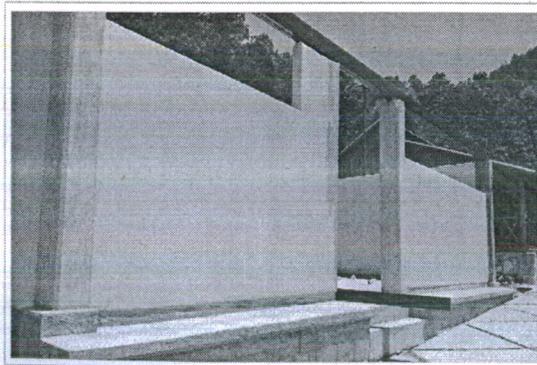


F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó la pavimentación del interior de la bodega, se repello para cubrir muros y columnas, así como se construyeron gradas para el acceso a la bodega, en los siguientes días colocaran la estructura metálica para el techado y con eso concluir con la Primera Etapa.

En atención a su Oficio No. 211-3/2019.-0639, informo a usted que con el recurso otorgado del FAM 2018 no se logró la culminación de la obra debido a que no ajusto el recurso, por lo que la obra se terminara con recursos del FAM 2019.

Se cambia la fecha de termino ya que la empresa aún no cuenta con la estructura, por lo que esta Casa de Estudios solicitara a INIFECH agilizar la terminación de la obra al 100%.



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
