




CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXA/ICD

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Dr. Isafías Elizarraraz Alcaraz

Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.



Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
06 de mayo de 2019

Oficio No. UNICH/CP/033/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de
abril.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de abril, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Abril 2019.

En atención a su Oficio No. 211-3/2019.-0639, informo a usted que con el recurso otorgado del FAM 2018 no se logró la culminación de la obra debido a que no ajusto el recurso, por lo que la obra se terminara con recursos del FAM 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación



C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril

FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 011-07MBU008J

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 85 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 85 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Especie/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional	X				\$ 996,796.85	\$ 996,796.85	\$ 0.00			108m2	Se realizó la presentación del interior de la bodega, se repuso para cubrir muros y columnas, así como se construyeron gradas para el acceso a la bodega, en los siguientes días colocaron la estructura metálica para el techo y con eso concluyó con la Primera Etapa.	Esta pendiente la colocación de la estructura metálica y los listones de piso por parte de la empresa constructora.	65%	24/12/18	14/06/19	Con el recurso otorgado por parte de FAM 2018 no se logró la culminación de la obra, por lo que se gestionó el recurso con el programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, siendo como resultado aprobado para la terminación de la obra.						
									TOTAL	0	0.00												
									TOTAL	0	0.00												
						\$996,796.85	\$996,796.85	\$0.00															

Dr. Jorge Iván Zúñiga Macías
Titular de la IESC.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES¹ Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán poner tanto fotos como sea necesario.² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2018

FAMDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Universidad Intercultural de CHIAPAS
 Por un Chiapas igualitario y plural

Porcentaje de avance

65%



ACTIVIDAD

2

Nombre de la obra:

Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional


CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

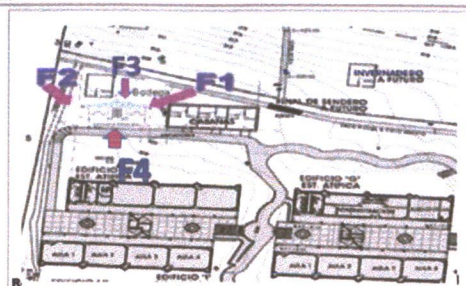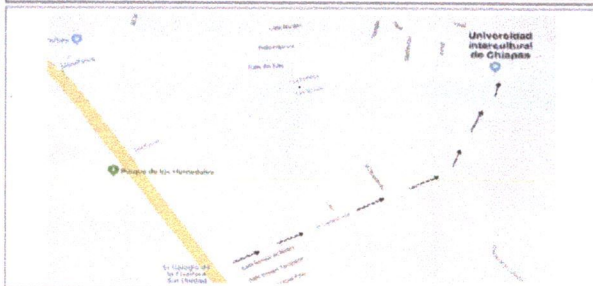

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS

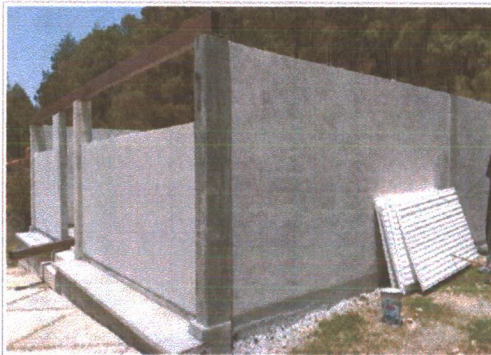


F1: Fachada principal



F2: Interior

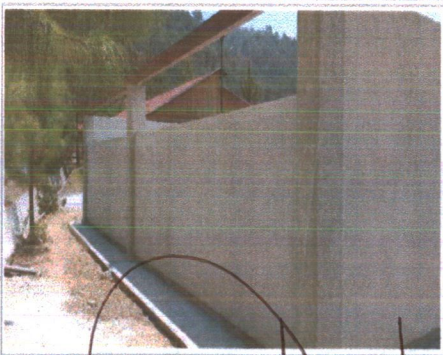


F3: Fachada posterior

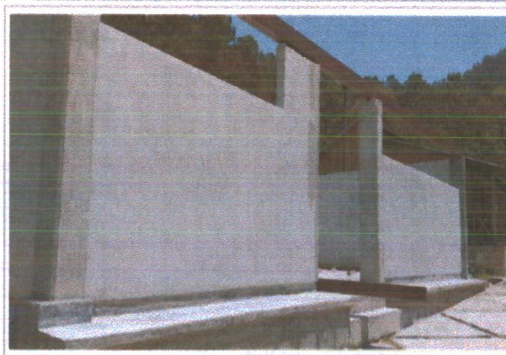

F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó la pavimentación del interior de la bodega, se repello para cubrir muros y columnas, así como se construyeron gradas para el acceso a la bodega, en los siguientes días colocaran la estructura metálica para el techo y con eso concluir con la Primera Etapa.


 Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
 Titular de la IES


 C.P. María Victoria Mora Gutiérrez
 Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
