



CHIAPAS  
GOBIERNO DEL ESTADO

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL



Universidad  
Intercultural  
de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;  
06 de mayo de 2019

Oficio No. UNICH/CP/034/2019  
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de  
abril.

**Dr. Isaías Elizarraraz Álcara**  
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU  
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de abril, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Abril 2019.


Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

**C.P. María Victoria Mota Gutiérrez**  
Coordinadora De Planeación  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.



2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 04MSU0001

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Cargo: Coordinadora de Planeación  
Teléfono: 987 63 1 48 88 Ext 132  
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Cargo: Coordinadora de Planeación  
Teléfono: 987 63 1 48 88 Ext 132  
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Cuales)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas					
		Obra de conservación	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Modernización				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Ac Administrat	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?		
1	Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.			X		\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	Bodega para el resalte del Archivo Histórico	1	108m <sup>2</sup>		El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2019 por la cantidad de \$996,799.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicitó recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de colocar satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	0%	03/06/19	15/11/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, traspaso el recurso a INFIECH que será la instancia ejecutora del recurso, por lo que estamos en gestión para que ejecuten el recurso referente a construcción.									
2	Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	X				\$ 591,813.00	\$ -	\$ 591,813.00	Sillas	8			Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Afianzados y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	03/06/19	13/06/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas traspaso el recurso a INFIECH por lo que estamos en gestión para que traspasen el recurso contemplado en equipamiento a nuestra Casa de Estudios.									
3	Equipamiento en la Unidad Central.	X				\$ 341,083.04	\$ -	\$ 341,083.04	Quirófano	1			Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	03/06/19	13/06/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas traspaso el recurso a INFIECH por lo que estamos en gestión para que traspasen el recurso contemplado en equipamiento a nuestra Casa de Estudios.									
4	Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano	X				\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00					Adecuación y remodelación de espacio para manutención de material vivo para prácticas experimentales, en busca de contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que se realizan en la Universidad en la Licenciatura de Médico Cirujano.	0%	10/06/19	17/12/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas traspaso el recurso a INFIECH que será la instancia ejecutora del recurso, por lo que estamos en gestión para que ejecuten el recurso referente a construcción.									
						\$1,902,897.63	\$0.00	\$1,902,897.63																		

Dr. Jorge Luis Zurri Macías  
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos, fotos con GPS, etc.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en formato: día, mes y año.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2019

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra:


**Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

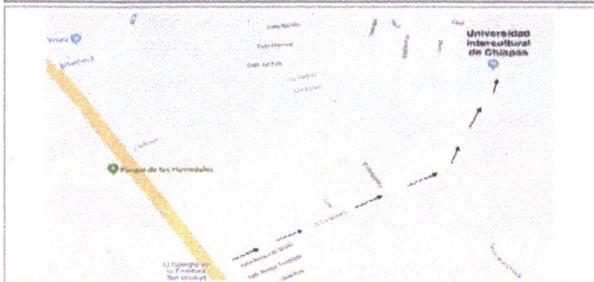

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

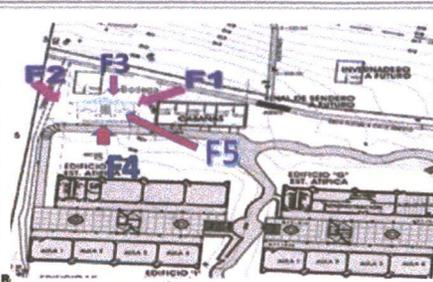


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

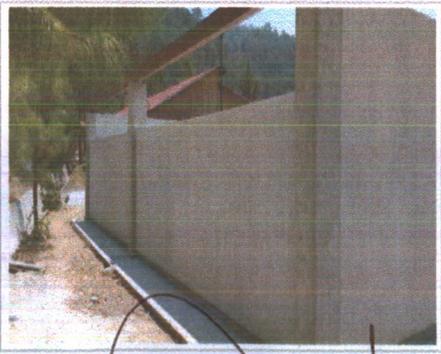

F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Primera Etapa de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.

El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías  
Titular de la IES

C.P. María Victoria Noya Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMARÍA

2

Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcooc, 30187 Las Margaritas, Chis.

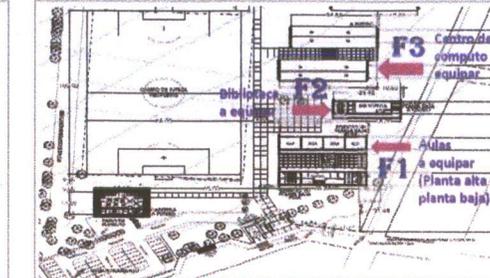

FOTOS



F1: Aulas a equipar




F2: Biblioteca a equipar

Comentarios de los trabajos realizados:


Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.



F3: Centro de computo a equipar



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zúñiga Machas  
Titular de la I.EE

C.P. María Victoria Iveta Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la I.EE

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0%

PREVISIONAL

3

Nombre de la obra: Equipamiento en la Unidad Central.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

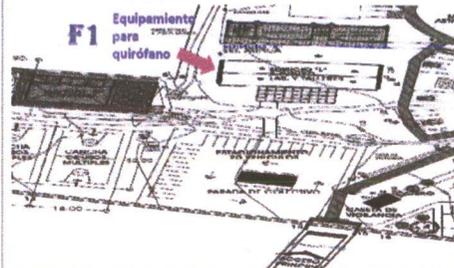

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS



F1: Espacio para equipar



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:  
Se envía fotos del espacio que se equipara.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zurut Macías  
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

# FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Abril**

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2019

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


# 0%

PREVIDENCIA

4

Nombre de la obra: **Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano.**


#### CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

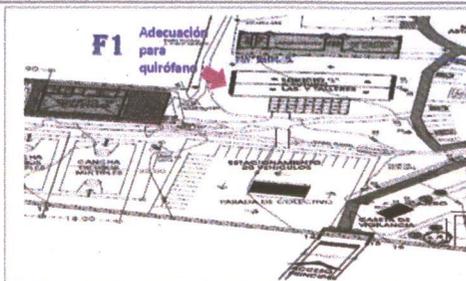

#### UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

### FOTOS

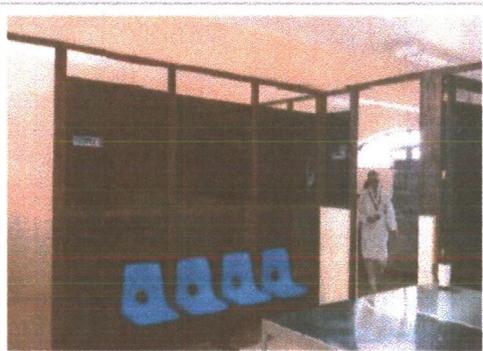

F1: Espacio para adecuar




F2: Interior


Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Se envía foto del espacio para adecuar.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zwart Macías  
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
