



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

S.E.P. 13-40
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
RECIBIDO
12 SEP 2019
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

S.E.P.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
13-37
12 SEP 2019
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de septiembre de 2019

Oficio No. UNICH/CP/061/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de agosto.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RECIBIDO
10:42
13 SEP 2019

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGEUSU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted para informarle que el presente informe correspondiente al mes de agosto, del avance de los trabajos de ejecución de la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Agosto 2019

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. (967) 63 161 52, 63
148 86, 63 148 88, Ext. 110, 132 y 145 www.unich.edu.mx

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
CGEIB

RECIBIDO
03 SEP 2019
COORDINACION DE PLANEACION
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

RECIBIDO
COPIAS DE CONOCIMIENTO

RECIBIDO
12 SEP 2019
COORDINACION GENERAL
2 Copias

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
12 SET. 2019
Hora: 10:10
Rev. 02 2019/02/01
RECIBIDO - PLANTA BAJA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management processes.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0096J

RESPONSABLES

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA


Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ¹	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ²		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Especio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Cuenta con Actas								
																				Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa						
1	Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.		X				\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	\$ 490,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera Etapa)	1	168m2		El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$906,798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	80%	01/08/19	15/12/19	La constructora NAKUM S.A de C.V. recibió de INIFECH el 30% de anticipo para realizar los trabajos de pintura, cancelería, colocación de puerta, ventanas, protecciones de ventanas, instalación eléctrica, colocación de interruptores, luminaria, colocación de señalamientos como detectores de humo, salida de emergencia, área de no fumar, botiquín, extintor; avanzando físicamente un 5% de los trabajos en este mes.										
2	Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.		X				\$ 561,613.99	\$ -	\$ 561,613.99	Salones Centro de computo Biblioteca	8 1 1		Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	14/10/19	15/11/19	Gobierno del Estado depósito al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas el recurso destinado a equipamiento, por lo que esta Casa de Estudios solicita a dicho Instituto el traspaso del recurso a la Universidad.											
3	Equipamiento en la Unidad Central.		X				\$ 341,083.64	\$ -	\$ 341,083.64	Quirófano	1		Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	14/10/19	15/11/19	Gobierno del Estado depósito al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) el recurso destinado a equipamiento, por lo que esta Casa de Estudios solicita a dicho Instituto el traspaso del recurso a la Universidad.											
4	Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano		X				\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00						0%			El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), nos presentó el Costo total de la Adecuación de obra, superando el monto asignado, por lo que con Oficio UNICHR/320/2019, se solicita a la Dirección de Fortalecimiento Institucional dependiente de la DGEUSU, que nos autorice modificación de meta, ocupando el recurso asignado para equipamiento en la Unidad Central del proyecto 3, siendo una necesidad contar con equipo de alta tecnología para la operatividad del Programa Educativo de Médico Cirujano.										
							\$1,902,697.63	\$210,000.00	\$1,692,697.63																			


Dr. Jorge Luis Juan Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd/mm/yy y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

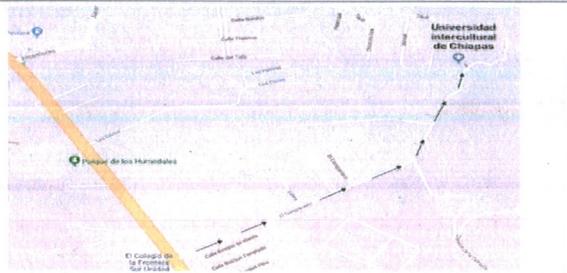 <p>Universidad Intercultural de CHIAPAS Por un Chiapas igualitario y plural</p>	<p>PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).</p>
	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	<p>FOTOS</p>

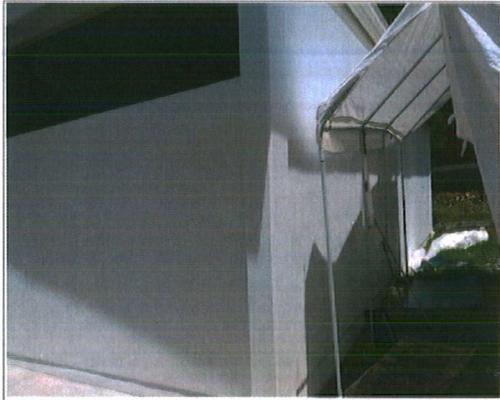


F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La constructora NAKUM S.A de C.V. realizo los trabajos de pintura, cancelería, colocación de puerta, ventanas, protecciones de ventanas, instalación eléctrica, colocación de interruptores, luminaria, colocación de señalamientos como detectores de humo, salida de emergencia, área de no fumar, botiquín, extintor.

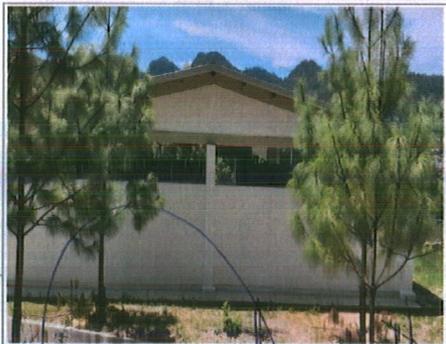

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Paralelo se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:



Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.



Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

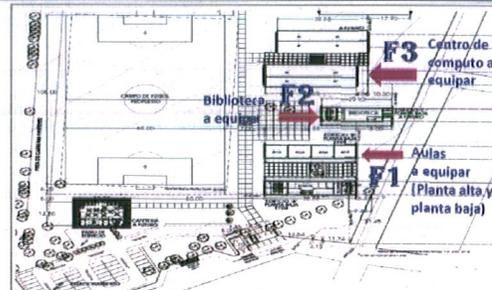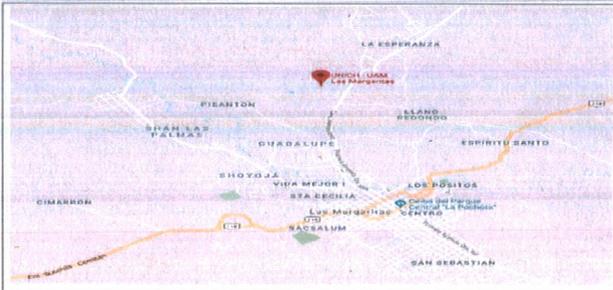

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoc, 30187 Las Margaritas, Chis.

FOTOS



F1: Aulas a equipar



F2: Biblioteca a equipar


Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.


Gobierno del Estado depósito al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas el recurso destinado a equipamiento, por lo que esta Casa de Estudios solicito a dicho Instituto el traspaso del recurso a la Universidad.



F3: Centro de cómputo a equipar



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. Maria Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:


Equipamiento en la Unidad Central.



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

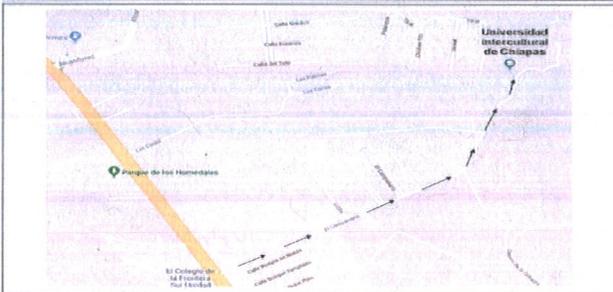

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

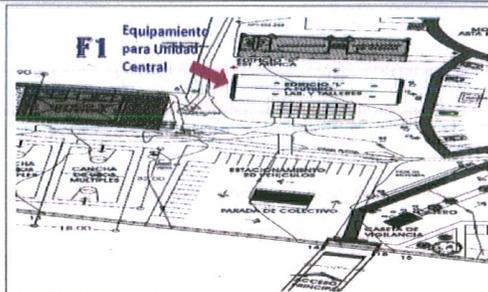

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Gobierno del Estado realizo la validación de las Fichas de Información Básica del proyecto, por lo que estamos solicitando al INIFECH transferian el recurso asignado a esta Casa de Estudios.

F1: Espacio para equipar

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuan Macias
Titular de la IES

C.P. Maria Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRICIDAD

4


Nombre de la obra: **Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

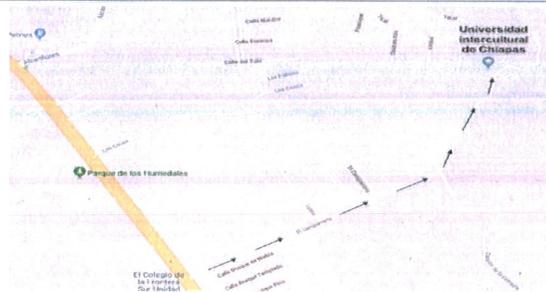

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

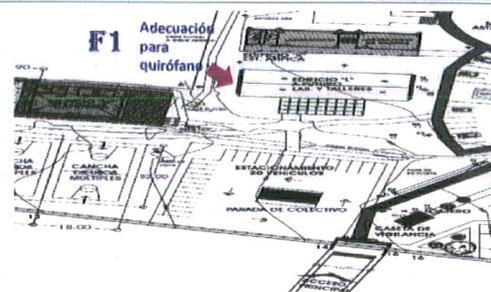

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), nos presentó el Costo total de la Adecuación de obra, superando el monto asignado, por lo que con Oficio UNICH/CP//2019, se solicita a la Dirección de Fortalecimiento Institucional dependiente de la DGESU, que nos autoricen modificación de meta, ocupando el recurso asignado para equipamiento en la Unidad Central del proyecto 3, siendo una necesidad contar con equipo de alta tecnología para la operatividad del Programa Educativo de Médico Cirujano.

F1: Espacio para adecuar

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: interior de aula

Dr. Jorge Luis Cuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
