

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
07 de junio de 2019

Oficio No. UNICH/CP/041/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de mayo.

Dr. Isaías Elizarraraz Ácaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de mayo, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Mayo 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente



C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Angeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado
Mayo
FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Especie/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.	X					\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera Etapa)	1	168m2	El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996,798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	0%	01/07/19	15/11/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas traspaso el recurso a INIFECH que será la instancia ejecutora del recurso, por lo que estamos en gestión para que ejecuten el recurso referente a construcción.							
2	Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	X					\$ 561,613.99	\$ -	\$ 561,613.99	Salones	8		Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	01/08/19	21/08/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas confirmo que no traspaso el recurso destinado a equipamiento a INIFECH, por lo que esta Casa de Estudios realizó Fichas de Información Básica ante Gobierno del Estado de acuerdo a la normatividad, en este momento se encuentra en validación para su autorización y liberación del recurso.							
3	Equipamiento en la Unidad Central.	X					\$ 341,083.64	\$ -	\$ 341,083.64	Quirófano	1		Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	14/10/19	31/10/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas confirmo que no traspaso el recurso destinado a equipamiento a INIFECH, por lo que esta Casa de Estudios realizó Fichas de Información Básica ante Gobierno del Estado de acuerdo a la normatividad, en este momento se encuentra en validación para su autorización y liberación del recurso.							
4	Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano	X					\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00				Adecuación y remodelación de espacio para manutención de material vivo para practicas experimentales, en busca de contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que se realizan en la Universidad en la Licenciatura de Médico Cirujano.	0%	15/07/19	17/12/19	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas traspaso el recurso a INIFECH que será la instancia ejecutora del recurso, por lo que estamos en gestión para que ejecuten el recurso referente a construcción.							
							\$1,902,697.63	\$0.00	\$1,902,697.63															

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que deberán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos de mm y aa.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROPIEDAD

1

Nombre de la obra:



Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

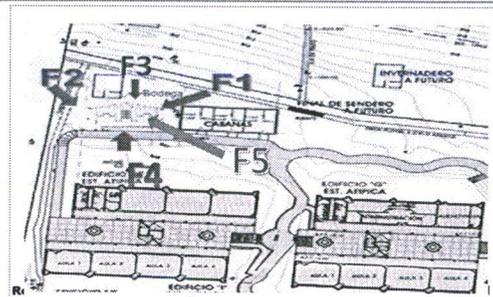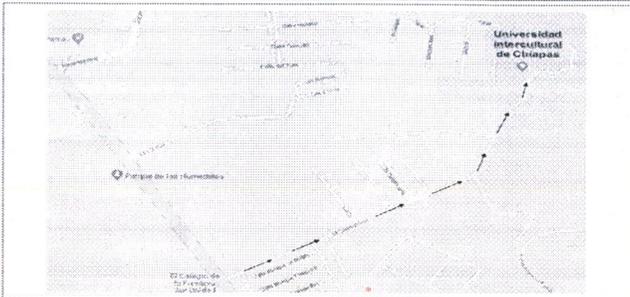


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS

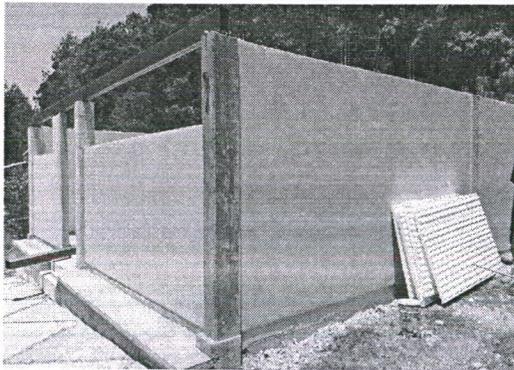


F1: Fachada principal

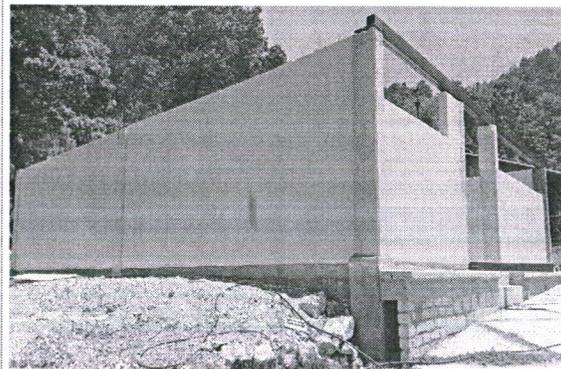


F2: lateral

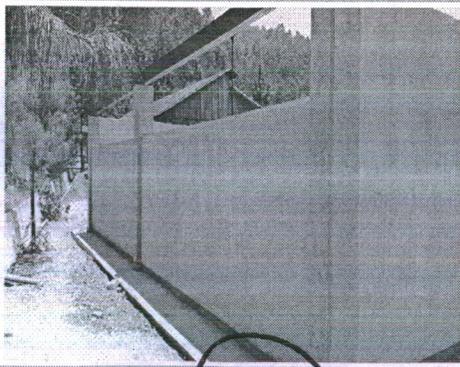

F3: fachada posterior

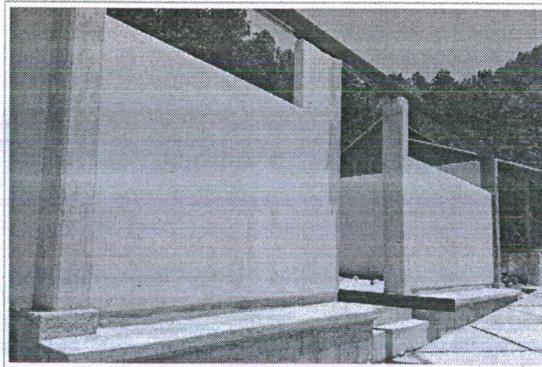

F4: Entrada

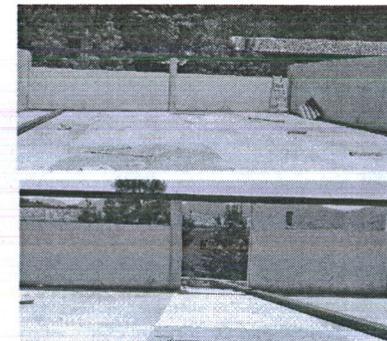

F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Primera Etapa de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.

El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.

Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.

Dr. Jorge Luis Zuñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

1

Nombre de la obra:



Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

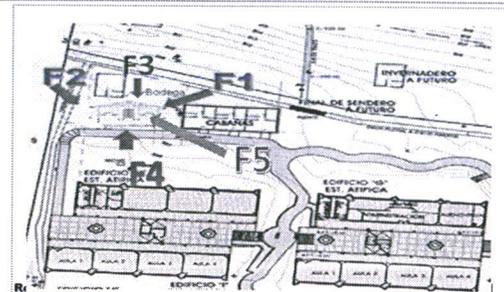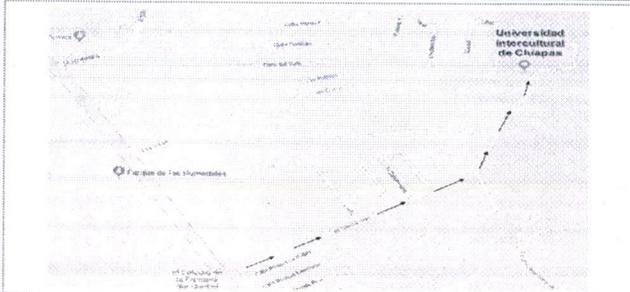


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS

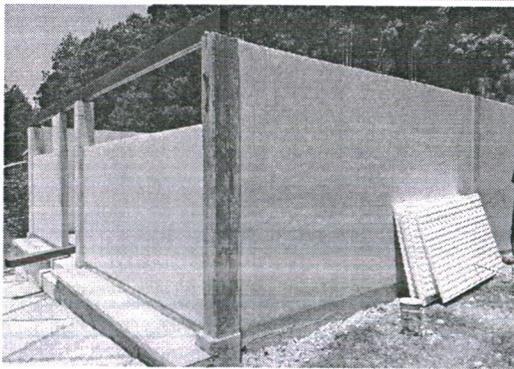


F1: Fachada principal

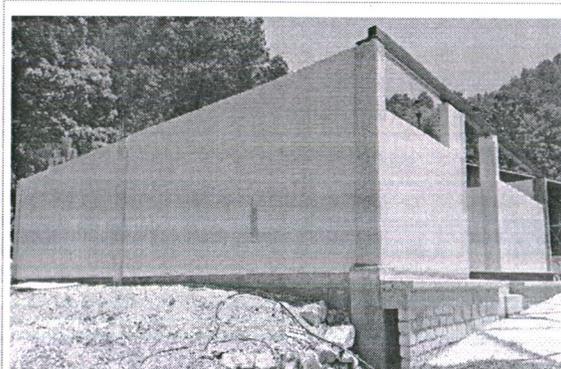


F2: lateral

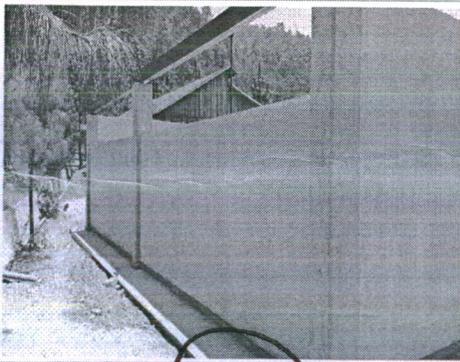

F3: Fachada posterior

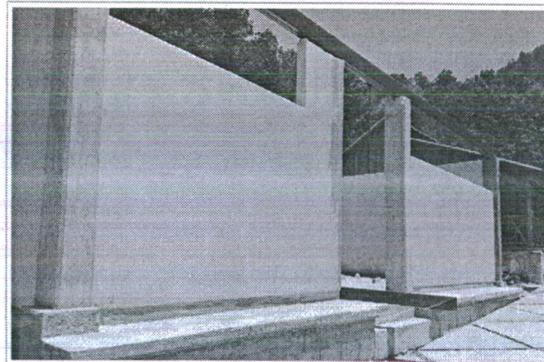

F4: Entrada

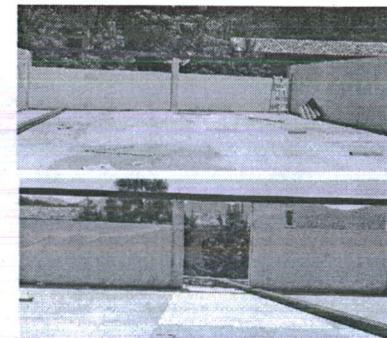

F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de la Primera Etapa de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.

El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996, 798.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.

Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.

Dr. Jorge Luis Zurut Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para enjuiciamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2


Nombre de la obra: Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

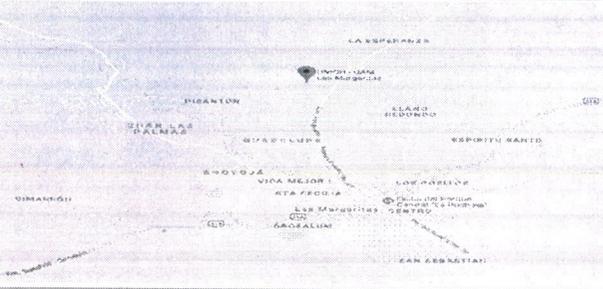


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoc, 30187 Las Margaritas, Chis.

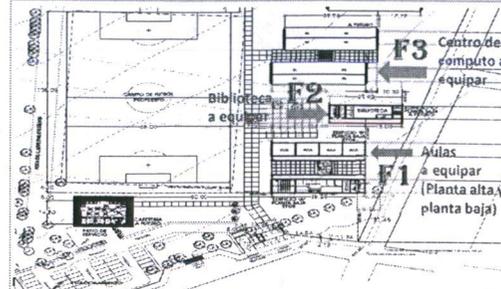

FOTOS

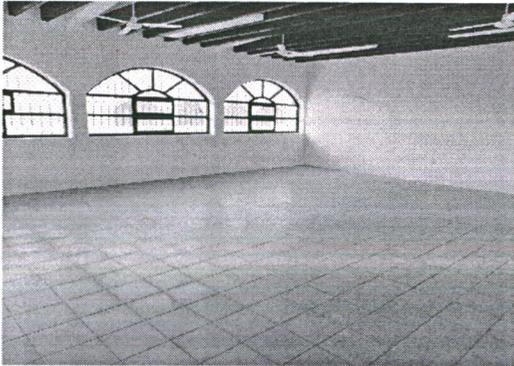

F1: Aulas a equipar

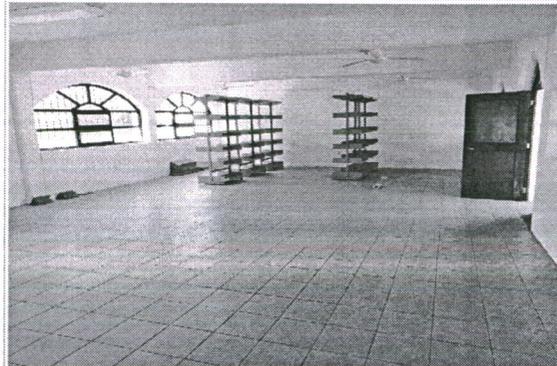


F2: Biblioteca a equipar


Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.

Se cambia fecha de inicio de equipamiento ya que estamos en proceso de liberación del recurso con Gobierno del Estado.

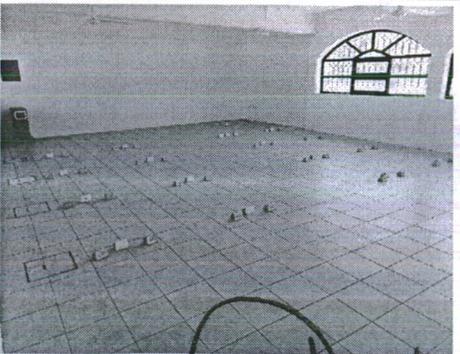

F3: Centro de computo a equipar



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Mayo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROPIEDAD

3



Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Central.**



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

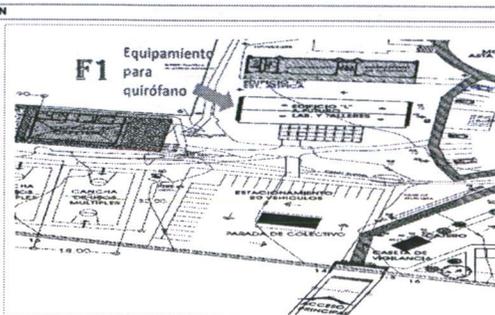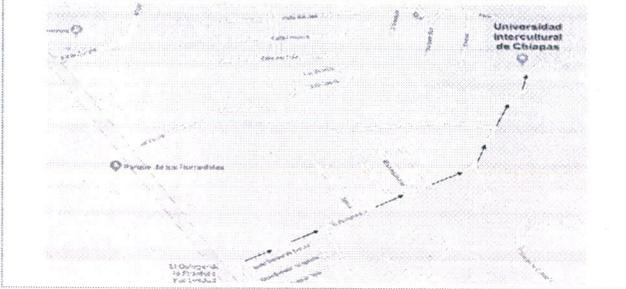


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

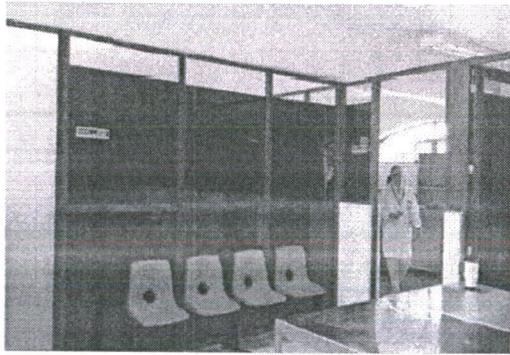

F1: Espacio para equipar




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos del espacio que se equipara.


Se cambia fecha de inicio de equipamiento ya que estamos en proceso de liberación del recurso con Gobierno del Estado.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aua

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

4


Nombre de la obra: **Adecuación de Obra en la Unidad Central en el Laboratorio de Médico Cirujano.**



Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

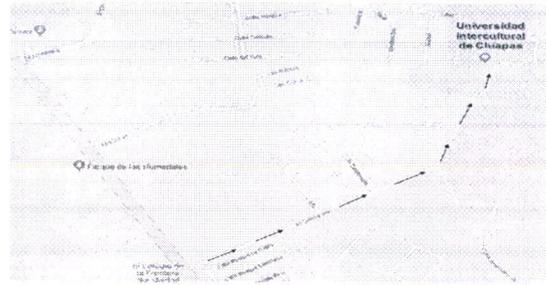


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

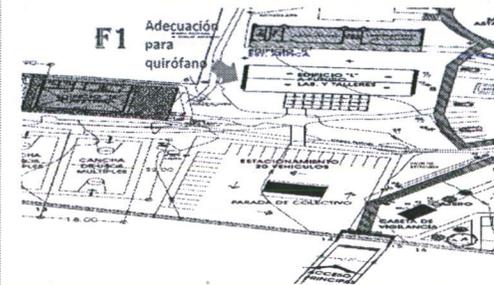

FOTOS

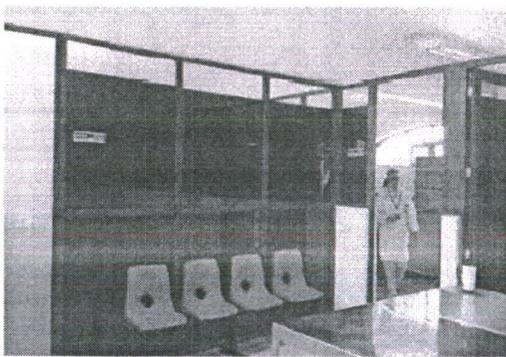

F1: Espacio para adecuar




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía foto del espacio para adecuar.

Se cambia fecha de inicio ya que INIFECH aún esta en proceso de liberación de recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar Para el antes, durante y después de la obra.
