

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de diciembre de 2019

Oficio No. UNICH/CP/78/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de
noviembre.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de noviembre, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas y Equipamiento en la Unidad, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	noviembre 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.



2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 30 de noviembre de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas				
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustitutivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.	X				\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	\$ 490,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera Etapa)	1	168m2	El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996,796.85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	98%	01/08/19	15/12/19	En el mes de noviembre la Empresa Constructora NAKUM S.A de C.V. colocó las divisiones (jaulas), por lo que al término de este mes está concluyendo con la colocación de los anaqueles.									
2	Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	X				\$ 561,613.99	\$ -	\$ 561,613.99	Salones	8		Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	14/10/19	15/12/19	El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) traspasó el recurso destinado a equipamiento a esta Casa de Estudios por lo que se están culminando los procesos para la ejecución.									
3	Equipamiento en la Unidad Central.	X				\$ 641,083.64	\$ -	\$ 641,083.64	Quirófano	1		Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	14/10/19	15/12/19	El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) traspasó el recurso destinado a equipamiento a esta Casa de Estudios por lo que se están culminando los procesos para la ejecución.									
						\$1,902,697.63	\$210,000.00	\$1,692,697.63																	

Dr. Jorge Luis Juan Macías
Titular de la IESC.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre



FECHA DE CORTE: 30 de Noviembre de 2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra:

Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

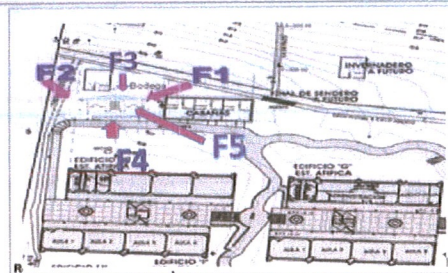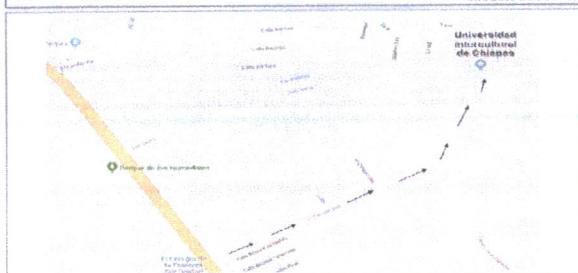

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas equitativo y plural

Porcentaje de avance

98%


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

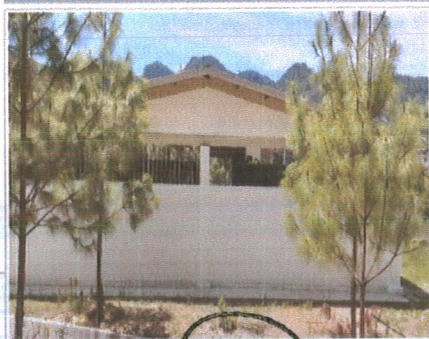

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de bodega

Comentarios de los trabajos realizados:

En el mes de noviembre la Empresa Constructora NAKUM S.A de C.V. colocó las divisiones (jaulas), por lo que al término de este mes esta concluyendo con la colocación de los anaqueles.

Dr. Jorge Luis Cuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 30 de noviembre de 2019

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural


Porcentaje de avance

0%

FACILIDAD 2

Nombre de la obra: Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

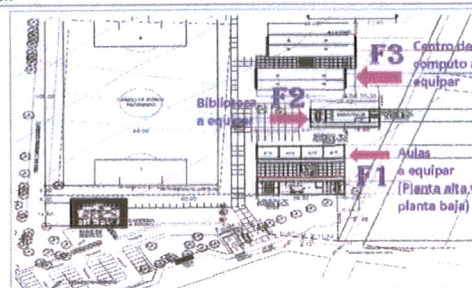

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoc, 30187 Las Margaritas, Chis.

FOTOS




F1: Aulas a equipar



F2: Biblioteca a equipar



F3: Centro de cómputo a equipar



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de cómputo que se equiparan.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) traspasó el recurso destinado a equipamiento a esta Casa de Estudios por lo que se están culminando los procesos para la ejecución.

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre

FECHA DE CORTE: 30 de noviembre de 2019

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento en la Unidad Central.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

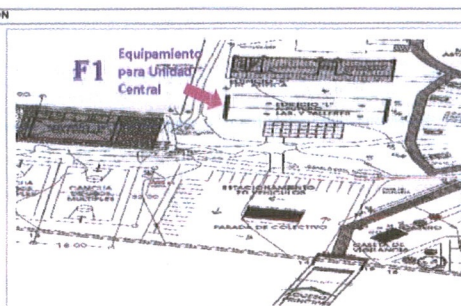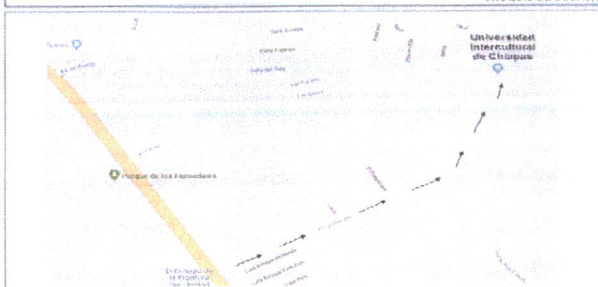


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS




F1: Espacio para equipar

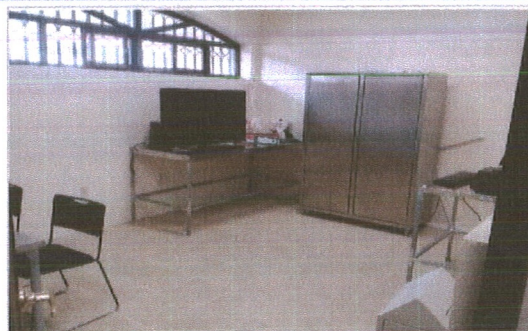


F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) traspasó el recurso destinado a equipamiento a esta Casa de Estudios por lo que se están culminando los procesos para la ejecución.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zúñiga Martínez
Titular de la IES

C.P. María Victoria Noya Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
