



Coordinación de Planeación

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
01 de octubre de 2019**

**Oficio No. UNICH/CP/067/2019
Asunto: Informe de FAM 2019 mes de septiembre.**

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de septiembre, del avance de Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2019.**

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2019).	Terminación de Obra en la Unidad Central, Equipamiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, Equipamiento en la Unidad Central y Adecuación en la Unidad Central, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2019).	Septiembre 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente,

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
01 OCT 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

Septiembre

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU008U

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext: 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext: 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Aderezaciones y regiones	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Acciones por realizar			% de avance	Inicio	Término	Observaciones	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																									Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central.	X				\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	\$ 490,000.00	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera Etapa)	1	168m2		El proyecto consiste en la terminación de la obra beneficiada con recurso del programa FAM 2018 por la cantidad de \$996, 798 85, ya que no fue suficiente para la conclusión total de dicha obra, por lo que se solicita recurso para la terminación de esta obra que incluye piso, repello, instalación eléctrica, herrería, pintura y acabados, con la finalidad de concluir satisfactoriamente y así darle uso a este bien.	80%	01/08/19	15/12/19	En el mes de Septiembre no hubo avance ya que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) no ministro Estimación. No 1 a la Empresa Constructora NAKUM S.A de C.V., para continuar con la obra, por lo que para inicio del mes de Octubre colocara anaqueles y divisiones (jaulas).										
2	Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	X				\$ 561,613.99	\$ -	\$ 561,613.99	Salones Centro de computo Biblioteca	8 1 1		Dotar de equipamiento básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo y Derecho Intercultural que se ofertan en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, así como dotar de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas.	0%	14/10/19	15/11/19	Gobierno del Estado depósito al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas el recurso destinado a equipamiento, por lo que esta Casa de Estudios solicito a dicho Instituto el traspaso del recurso a la Universidad.											
3	Equipamiento en la Unidad Central	X				\$ 641,083.64	\$ -	\$ 641,083.64	Quirófano	1		Dotar de equipamiento básico para la operación del Programa Educativo de Médico Cirujano que se oferta en la Unidad Central San Cristóbal de las Casas.	0%	14/10/19	15/11/19	Debido a la modificación de meta autorizada, se esta realizando los cambios de la Ficha de Información Básica de Proyecto ante Gobierno del Estado, para que se solicite la validación y el depósito correspondiente al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) y posteriormente solicitar el traspaso de recurso a nuestra Casa de Estudios.											
						\$1,902,697.63	\$210,000.00	\$1,692,697.63																			

Dr. Jorge Luis Zuñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en los dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2019

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:



Terminación de Obra o Complementos (Obra de Continuidad) en la Unidad Central. (Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional).



Porcentaje de avance

80%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

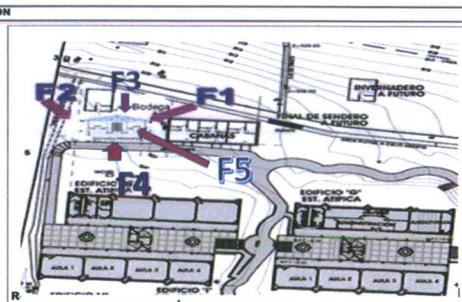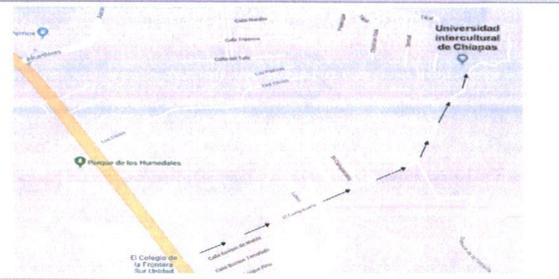

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS

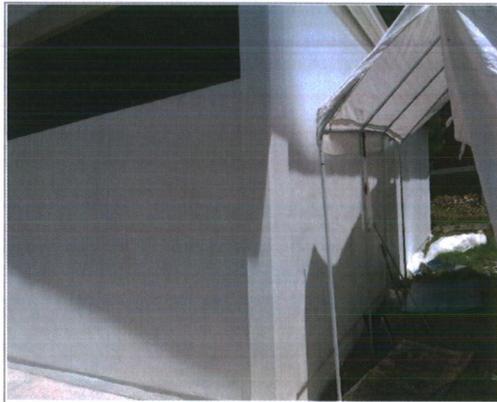


F1: Fachada principal



F2: lateral

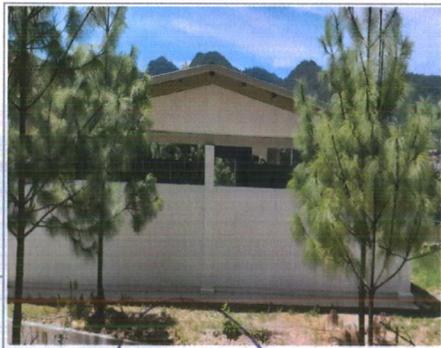

F3: Fachada posterior

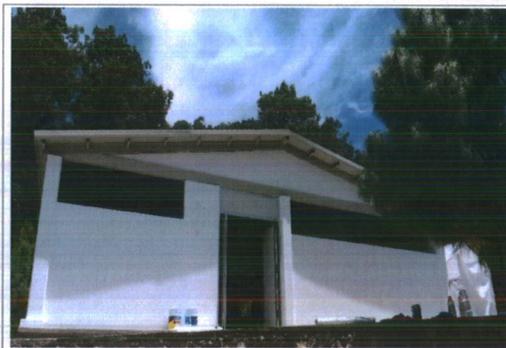

F4: entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

En el mes de Septiembre no hubo avance ya que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) no ministro Estimación. No 1 a la Empresa Constructora NAKUM S.A de C.V., para continuar con la obra, por lo que para inicio del mes de Octubre colocara anaqueles y divisiones (jaulas).

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:


Equipamiento en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.




Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

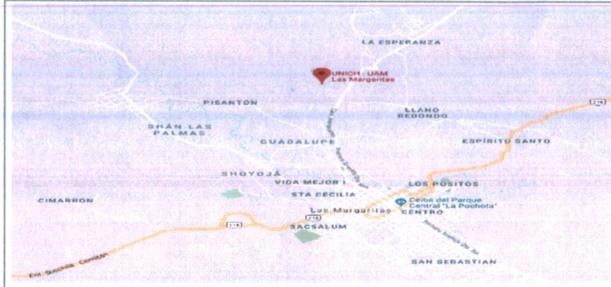

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

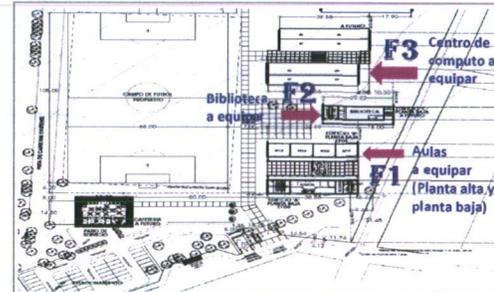

23a Calle Norte Pte No 12, Barrio de Yalcoo, 30187 Las Margaritas, Chis.

FOTOS



F1: Aulas a equipar



F2: Biblioteca a equipar


Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de las aulas, biblioteca y centro de computo que se equiparan.


Gobierno del Estado depósito al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas el recurso destinado a equipamiento, por lo que esta Casa de Estudios solicito a dicho Instituto el traspaso del recurso a la Universidad.



F3: Centro de computo a equipar



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria María Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Equipamiento en la Unidad Central.**




Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

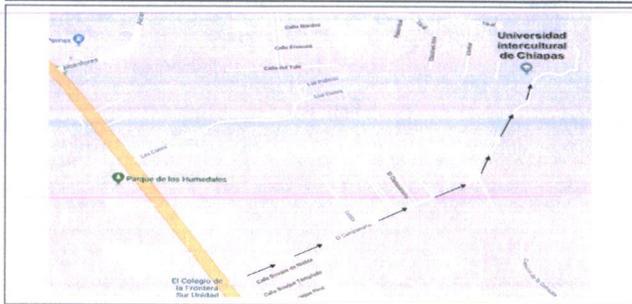

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

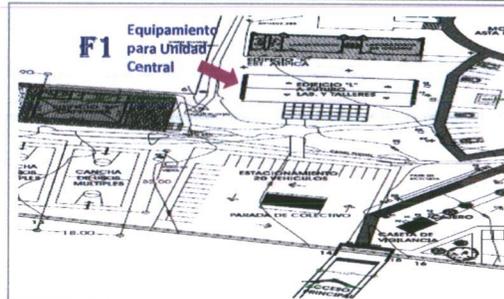

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS




F1: Espacio para equipar




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Debido a la modificación de meta autorizada, se esta realizando los cambios de la Ficha de Información Básica de Proyecto ante Gobierno del Estado, para que se solicita la validación y el depósito correspondiente al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) y posteriormente solicitar el traspaso de recurso a nuestra Casa de Estudios.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
