

Rectoría

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;  
07 de julio de 2021**

**Oficio No. UNICH/R/197/2021  
Asunto: Envío de informe 2º. Trimestre  
ProExES 2020 - Vertiente A.**

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
**Directora General de Educación Superior**  
**Universitaria e Intercultural**  
**Ciudad de México, Méx.**

En el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior [Tipo Superior] (ProExES) Ejercicio Fiscal 2020 - Vertiente A, me permito enviar a usted en los formatos solicitados por la DUI-CGEIB, informe trimestral correspondiente al Segundo Trimestre 2021 (abril - junio), del Proyecto **“Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional”**, autorizado en el ProExES 2020.

Anexo a la presente documentación soporte al informe.

Sin más por el momento de expreso mis consideraciones.

**Respetuosamente**



**Dra. Leticia Pons Bonals**  
**Rectora**



**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.**

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento  
C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Área de la CGEIB.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro Roberto Salcedo Aquino.- Secretario de la Función Pública. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo Minutario.

Sección: 03C Programación, Organización y Presupuestación.  
Serie: 03C.06 Registro Programático de Proyectos Especiales.  
Subserie:03C.06.01 PROEXES.

**SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL INCREMENTO DE MATRÍCULA**  
 (El presente Formio no debe ser modificado ni ahorrado en ninguno de sus apartados)  
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 07 de julio de 2021

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 (Tipo Superior), Vertiente A	Ejercicio Fiscal Reportado	2021
---	----------------------------	------

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre: Segundo Trimestre 2021

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

**Objetivo General:** Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad es fortalecer la capacidad y competitividad académica, para lo cual es necesario proporcionar espacios y equipamiento adecuado para la operación de los programas educativos que redunde en la formación de estudiantes con calidad. Durante los primeros 15 años se ha centrado las bases para que la UNICH cuente con una infraestructura óptima para su quehacer institucional, particularmente en el componente académico, la cobertura de los servicios, se realiza a través de la Sede Central y de las cuatro Unidades Académicas Multidisciplinarias (Ocosingo, Las Margaritas, Yajalón y Villahermosa); la oferta educativa está integrada por seis Programas Educativos (Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Medicina Curativa y Derecho Intercultural) y una tendencia ascendente en la matrícula de estudiantes. En la Sede Central, ubicada en San Cristóbal de las Casas se imparten cinco Licenciaturas: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo y Medicina Curativa, las cuales están en proceso para la acreditación, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas se ofertan tres Licenciaturas: Turismo Alternativo y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural y en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Villahermosa se ofertan dos Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo, es la base donde se sustenta el proyecto propuesto.

PROYECTO DERIVADO A:			
Creación de nuevas escuelas, plantales o unidades técnicas (cuando para Universidades Interculturales)	Medioidad 1	Programas Educativos de TSU y Licenciatura que aún no cuentan con una generación de egresados (programas de reciente creación)	Medioidad 2
Creación de nuevos programas educativos	Medioidad 2	Proyectos de Equipamiento	Medioidad 3

Costo total del Proyecto ProExES 2020 (Por rubro)	Obras	Equipamiento	Total
	\$60,125,000.00	\$6,859,142.00	\$66,984,142.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2020	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido 2021	Monto Ejercido en 2021*				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2021	MONTO TOTAL EJERCIDO	RENTREGA A LA TERCERA 2021	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									Monto reportado por Trimestre								
									Ene-Mar (15 de abril)	Abr-Jun (16 de julio)	Jul-Sept (16 de octubre)	Oct-Dic (16 enero 2021)					
1	Repletar la infraestructura física, construcción de nuevos espacios educativos.	1.1 Operar la disponibilidad de espacios para la atención de los estudiantes de la Licenciatura de Medios Digitales	1.1.1	Construcción de dos edificios en la Sede Central, Cuarta Etapa del Plan Maestro de construcción.	800,000,000.00	Obras	6 60,000,000.00	90.00	13,653,714.76	18,887,934.76	0.00	0.00	34,491,649.52	24,481,648.56	14,487,917.46	23,926,739.96	80.82
		1.2 Recibir agua en la Sede Central	1.2.1	Construcción de un sistema captación y almacenamiento de agua de lluvia.	\$125,000.00	Obras	\$125,000.00	99.99	37,500.00	16,376.00	0.00	0.00	122,776.00	122,776.00	0.00	3,329.04	96.22
2	Asegurar la calidad en la operación de los programas educativos que integran la oferta institucional, equipando los espacios físicos de la Sede Central.	2.1 Fortalecer los servicios administrativos que se brindan a los estudiantes.	2.1.1	Dotar de equipamiento especializado para la atención de los estudiantes de los Programas Educativos que se ofertan en la Sede Central.	\$1,536,000.00	Equipamiento	\$1,836,000.00	\$1,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,000.00	0.00	0.00	100.00
		2.2 Garantizar la permanencia de los Programas Educativos.	2.2.1	Adquisición de diversos tipos de equipo para la fortalecer y mejorar las prácticas de los estudiantes y profesores del Programa Educativo en Turismo Alternativo.	\$559,500.00	Equipamiento	859,500.00	859,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00	906.00
3	Fortalecer la operación con calidad, equipando los aspectos físicos de las Unidades Académicas Multidisciplinarias.	3.1 Brindar Educación de vanguardia a los estudiantes de la Licenciatura en Derecho Intercultural	3.1.1	Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas.	\$425,500.00	Equipamiento	\$425,500.00	\$425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	100.00
			3.1.2	Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo.	\$425,500.00	Equipamiento	\$425,500.00	\$425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	100.00
			3.1.3	Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.	\$425,500.00	Equipamiento	\$425,500.00	\$425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	100.00
		3.2 Activación de espacios educativos para la mejor atención de estudiantes aprendices de los Programas Educativos.	3.2.1	Dotar de equipamiento básico la biblioteca, sala de cómputo y sala de videoconferencias para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	\$1,996,000.00	Equipamiento	\$1,996,000.00	\$1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00	100.00
		3.2.2	Adquisición de equipamiento básico para una sala de difusión y orientación universitaria para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.	\$634,042.00	Equipamiento	\$634,042.00	\$634,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,042.00	0.00	0.00	100.00	
		3.2.3	Dotar de material e inventario para la operación del Programa Educativo en Desarrollo Sustentable en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo.	\$16,500.00	Equipamiento	\$16,500.00	\$16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL INCREMENTO DE MATRÍCULA  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 07 de julio de 2021  
CARRANZO

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 (Tipo Superior), Vertiente A	Ejercicio Fiscal Reportado	2021
---	----------------------------	------

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre: Segundo Trimestre 2021

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

**Objetivo General:** Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad es fortalecer la capacidad y competitividad académica, para lo cual es necesario proporcionar espacios y equipamiento adecuado para la operación de los programas educativos que redunde en la formación de estudiantes con calidad. Durante los primeros 15 años se ha sentido las bases para que la UNICH cuente con una infraestructura óptima para su quehacer estudiantil, particularmente en el componente académico, la cobertura de los servicios, se realiza a través de la Sede Central y de las cuatro Unidades Académicas Multidisciplinarias (Ocosingo, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tuxtla); la oferta educativa está integrada por veis Programas Educativos (Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Medio Ambiente y Derecho Intercultural) y una licenciatura académica en la matrícula de estudiantes. En la Sede Central, alojada en San Cristóbal de las Casas se imparten cinco Licenciaturas: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo y Médico Quirúrgico, los cuales están en proceso para la acreditación, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón se ofertan tres Licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural y en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle del Tuxtla se ofertan dos Licenciaturas: Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo, es la base donde se sustenta el proyecto propuesto.

Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Unidad	Equipamiento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.3 Fortalecer los servicios administrativos que se brindan a los estudiantes.	3.1	Dotar de Equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo.	\$68,200.00	Equipamiento	\$68,200.00	\$68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.2	Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle del Tuxtla.	\$30,000.00	Equipamiento	\$30,000.00	\$30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>98,200.00</b>		<b>98,200.00</b>	<b>98,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>								

Si el recurso a reportar es efectivamente pagado o "Cauto Pagado":

**RECURSO COMPROMETIDO.** Especificar el (los) documento(s) (Comiso, Conveio u otro) de pago, fecha y monto con IVA incluido, con el (los) cutrés) la IES evidencie que el recurso público federal extraordinario se encuentre "comprometido" con fecha límite del 31 de diciembre 2020 (Permitir en formato o por correo-e copia PDF de) (los) documento(s) relacionados(s).

Conveio de Coordinación Internacional INPECH-UNICH celebrado el día 1 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$125,000.00; Conveio de Coordinación Internacional INPECH-UNICH celebrado el día 1 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$125,000.00; Contrato de obra pública 2042002-0076 de fecha 30 de diciembre de 2020 por un monto de \$45,612,382.95; Análisis de Pagos por Clasificación Administrativa EPD1 con fecha 31 de diciembre de 2020.

**INFORME TÉCNICO.** En el caso que el proyecto implique construcción, referir por cada obra apoyada con recursos del ProExES 2020 el Avance Físico y Financiero en porcentaje al trimestre que se reporta. En su caso indicar: NO APLICA.

INPECH comprueba la ejecución del recurso con las transferencias y facturas que se anexan y relacionan en el formato 3.1 de Informe Financiero y Detalle Acción 1.1.1 en el Primer Trimestre 2021 se comprobó con Factura No. 9 por la cantidad de \$13,653,714.78, para este Segundo Trimestre 2021 se comprueba con Factura No. 6 por la cantidad de \$2,003,057.51, Factura No. 14 por la cantidad de \$4,254,931.91, Factura No. 16 por la cantidad de \$2,451,254.96, Factura No. 16 por la cantidad de \$2,148,900.39, correspondiente al 40.82% de avance del monto asignado y un 31% de avance físico. Acción 1.2.1 en el Primer Trimestre 2021 se comprobó con Factura No. 436 A por la cantidad de \$37,590, para este Segundo Trimestre 2021 se comprueba con Factura No. 437 A por la cantidad de \$75,237.07, Factura No. 438 A por la cantidad de \$10,010.01, correspondiente al 98.22% de avance del monto asignado y un 100% de avance físico.

**INFORME PORCENTUADO DE LA META ACADÉMICA ALCANZADA POR LA IES:** Con el informe trimestral final que compruebe el ejercicio del 100% del recurso federal ministerial (incluyendo en su caso productos financieros generados), y una vez que se disponga de los datos, reportar el Incremento de Matrícula del ciclo escolar 2021-2022 contra la del ciclo 2020-2021 por cada Programa Educativo beneficiado con recursos del ProExES 2020.

En este informe no se puede reportar el incremento de matrícula del ciclo escolar 2021-2022 ya que el momento nos encontramos en el ciclo escolar 2020-2021, por lo que este reporte se informará en el cuarto trimestre del 2021.

**PRODUCTOS FINANCIEROS.** Especificar el monto de los productos financieros, en su caso, generados al trimestre que se reporta, señalando la Acción o Acciones de destino con su respectivo monto. Además de lo anterior, es necesario que los productos financieros se sumen al recurso ejercido en el trimestre y Acción correspondiente.

No se generaron productos financieros.

**CONSIDERACIONES GENERALES.** Registrar las observaciones o comentarios que se consideren importantes para la selección y comprensión de la información contenida en el presente informe trimestral.

La Federación miembro el Estado de Chiapas y sede física la UNICH el día 17/11/2020 la cantidad de \$66,930,638.91 (Seiscientos y ocho millones novecientos treinta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos 91/100) y el día 31/12/2020 la cantidad de \$8,633,503.09 (Ocho millones seiscientos treinta y tres mil quinientos tres pesos 09/100 M.N.) Se aclara que este informe se elaboró con base en la información que obra actualmente en los archivos del área administrativa de la Institución, ya que fue ejercido en la administración anterior y no espera liquidación en el proceso de entrega recepción.

Mónica Ruiz Cruz  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Dr. Angel Gabriel Lopez Arens  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Dra. Lucille Pons Bonilla  
RECTORA

Lic. Antonia Hernández Jarrón  
CONTRALORA SOCIAL

En congruencia con el Convenio de Colaboración Financiera y Criterios para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, conservación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la Institución se sujetó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, antes de carácter obligatorio que correspondan, así como con sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:** La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrita, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá corresponder con la del proyecto apoyado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe la publicada en la página Web de la Institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



- 3.1 Formato Informe Financiero

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

ProExES 2020, Vertiente A

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL \* INCREMENTO DE MATRÍCULA  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 07 de julio de 2021  
DOMMAÑO

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 (TIPO SUPERIOR), Vertiente A Ejercicio Fiscal reportado 2021


Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas Trimestre Segundo Trimestre 2021

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

No. Acción	Registro de Documento(s) EFECTIVAMENTE PAGADOS					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos					Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Monto ejercido 2020 - 2021	Reintegro a la FESOFE 2021	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Construcción de doce edificios en la Sede Central, Cuarta Etapa del Plan Maestro de construcción.						\$ 80,000,000.00	\$ 13,853,714.78	\$ 14,487,817.45	\$ 10,837,934.79	\$ 10,837,934.79	\$ 21,020,733.00	\$ 21,020,733.00
1.1.1	Factura	10/03/2021	K9C151218SS9	9	Construcción	Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,003,057.51	\$ 2,003,057.51	\$ -	\$ -
1.1.1	Factura	28/04/2021	K9C151218SS9	14	Construcción	Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,254,631.91	\$ 4,254,631.91	\$ -	\$ -
1.1.1	Factura	03/06/2021	K9C151218SS9	15	Construcción	Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,431,254.98	\$ 2,431,254.98	\$ -	\$ -
1.1.1	Factura	19/06/2021	K9C151218SS9	16	Construcción	Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,148,990.39	\$ 2,148,990.39	\$ -	\$ -
1.2.1	Construcción de un sistema captación y almacenamiento de agua de lluvia.						\$ 125,000.00	\$ 37,500.00	\$ -	\$ 85,276.88	\$ 85,276.88	\$ 2,223.02	\$ 2,223.02
1.2.1	Factura	05/04/2021	CEM130111RD9	437 A	Construcción	Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,287.87	\$ 76,287.87	\$ -	\$ -
1.2.1	Factura	12/04/2021	CEM130111RD9	438 A	Construcción	Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,019.01	\$ 10,019.01	\$ -	\$ -
2.1.1	Dotar de Equipamiento especializado para la atención de los estudiantes de los Programas Educativos que se ofertan en la Sede Central.						\$ 1,936,000.00	\$ 1,936,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.1	Adquisición de diversos tipos de equipo para la fortalecer y mejorar las prácticas de los estudiantes y profesores del Programa Educativo en Turismo Alternativo.						\$ 559,900.00	\$ 559,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1	Adquisición de equipamiento especializado para el fortalecimiento de una sala de talleres artes para la operación del Programa Educativo en Comercio Institucional en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas.						\$ 425,500.00	\$ 425,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.2	Adquisición de equipamiento especializado para el fortalecimiento de una sala de talleres artes para la operación del Programa Educativo en Derecho Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.						\$ 425,500.00	\$ 425,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.3	Adquisición de equipamiento especializado para el fortalecimiento de una sala de talleres artes para la operación del Programa Educativo en Desarrollo Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.						\$ 425,500.00	\$ 425,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.1	Dotar de equipamiento básico de biblioteca, sala de cómputo y sala de videoconferencias, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.						\$ 1,996,000.00	\$ 1,996,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.2	Adquisición de equipamiento básico para una sala de diseño y extensiones universitarias, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.						\$ 634,042.00	\$ 634,042.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.3	Dotar de material el Invernadero para la operación del Programa Educativo en Desarrollo Sustentable en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.						\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3.3.1	Dotar de Equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oaxtepec	\$60,200.00	\$60,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.2	Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Tullja	\$380,000.00	\$380,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		68,664,142.00	20,613,866.76	14,804,117.45	10,923,211.77	10,923,211.77	21,022,898.02	21,022,898.02

  
 Mtra. Maritza Ruiz Cruz  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

  
 Dr. Ángel Gabriel Lopez Arens  
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

  
 Dra. Leticia Pons Bonals  
 RECTORA

  
 Lic. Antonia Hernández Girón  
 CONTRALORA SOCIAL

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y Criterios para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la Institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como con sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:** La información proporcionada en este Formato, en la referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá corresponder con la del proyecto apoyado y a los Informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.


La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la Institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe la misma que la publicada en la página Web de la Institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la Institución.

**DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS**



**OBRA:** CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL (UNICH)  
**LOCALIDAD:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
**MUNICIPIO:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

**CONTRATISTA:** KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.  
**No. DE CONTRATO:** 2042001-057  
**MONTO DE CONTRATO:** \$45,512,382.55  
**META:** CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

**REPORTE FOTOGRAFICO (ANTES)**

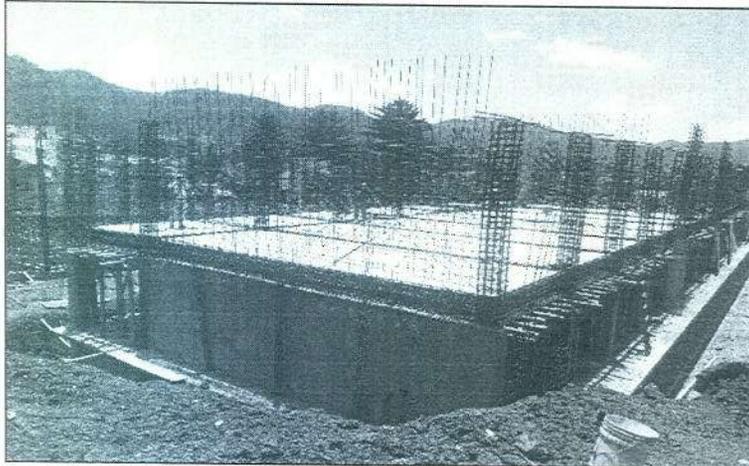

**EDIFICIO B**

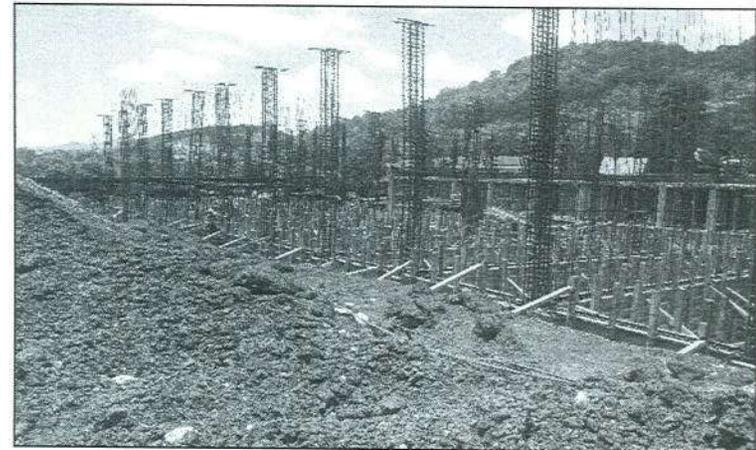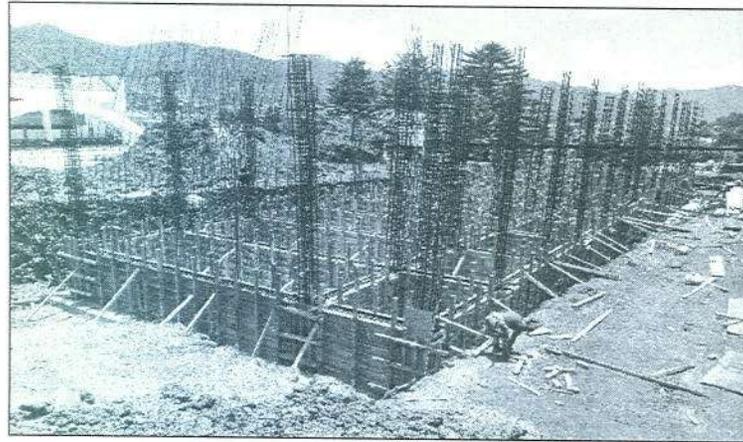

**DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS**

**OBRA:** CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL

**LOCALIDAD:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

**MUNICIPIO:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS




**CONTRATISTA:** KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

**No. DE CONTRATO:** 2042001-057

**MONTO DE CONTRATO:** \$45,512,382.55

**META:** CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

**REPORTE FOTOGRAFICO (DURANTE)**

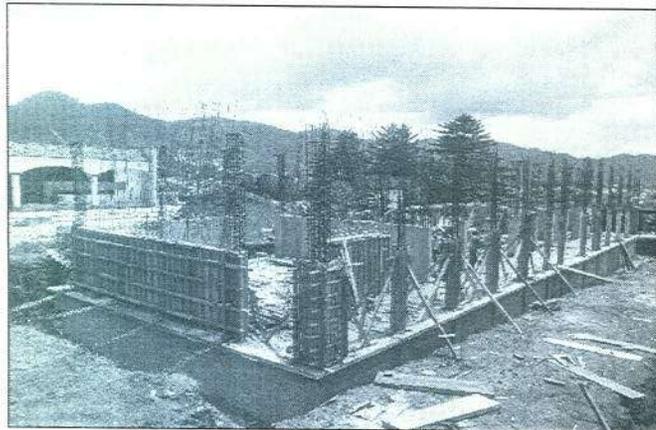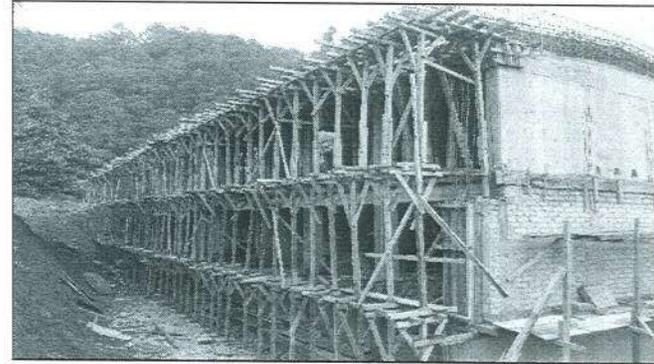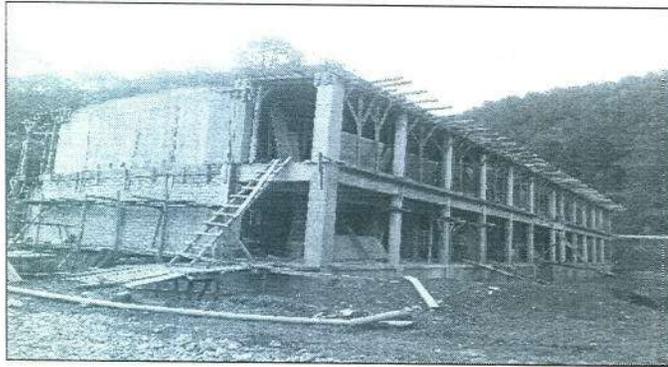

Handwritten blue scribbles.

DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS

OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL

LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS



CONTRATISTA: KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO: 2042001-057

MONTO DE CONTRATO: \$45,512,382.55

META: CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO (DESPUES)

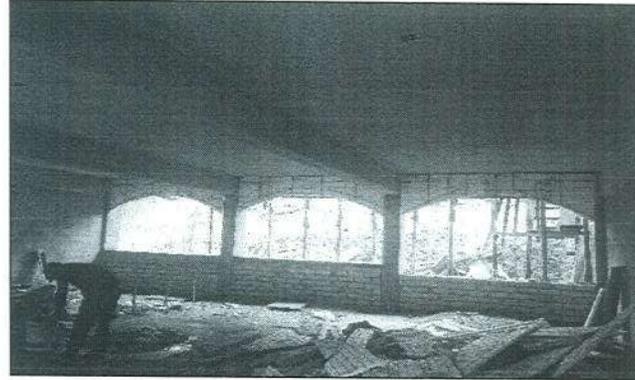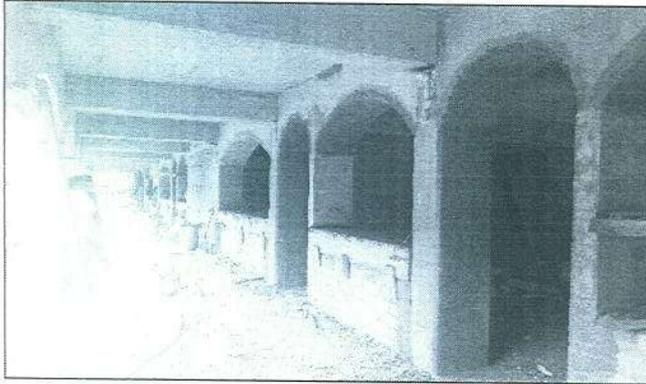

EDIFICIO B



PLAZA CENTRAL



ESTACIONAMIENTO

Handwritten blue scribbles.

**DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS**

**OBRA:** CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL

**LOCALIDAD:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

**MUNICIPIO:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

**CONTRATISTA:**

**No. DE CONTRATO:**

**MONTO DE CONTRATO:**

**META:**



KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

2042001-057

\$45,512,382.55

CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

**REPORTE FOTOGRAFICO (DESPUES)**

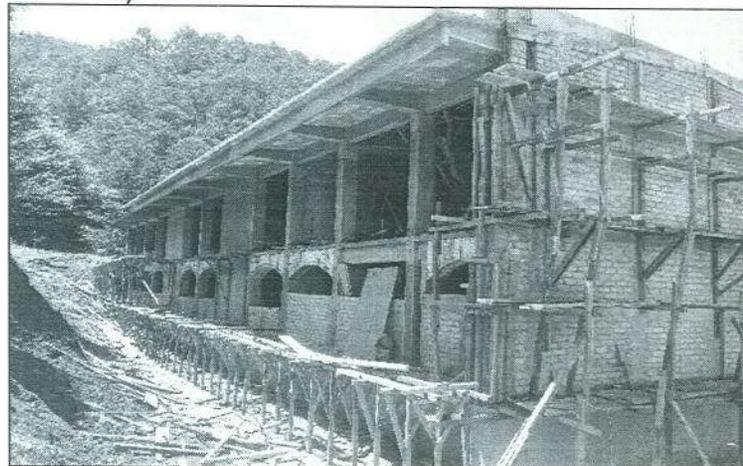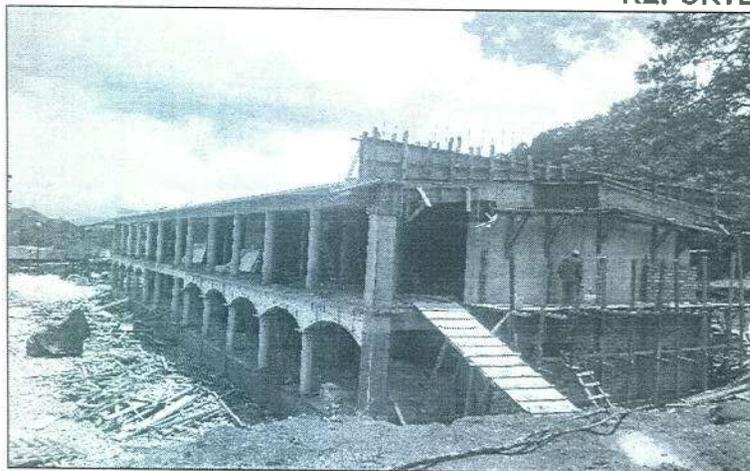

**EDIFICIO B**





Reporte de Transferencias SPEI

BANCO BISTANTE DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

17/03/2021 14:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	1124821755 ✓
Nombre del Ordenante	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC o CURP del Ordenante	IIF080705F48
Moneda	MXP
ID Tercero	65505470300
Nombre del Beneficiario	KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, ✓ S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	014100655054703005
RFC Beneficiario	KSC151218SS9 ✓
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,003,057.51 ✓
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/03/2021
Número de Referencia	9
Propósito de la Transferencia	EST 01 F9 CO2042001 057
Clave de Rastreo	8846APR2202103171236359693
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ
Fecha Captura	17/03/2021 13:49:41 p. m.
Ejecutó	LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS
Fecha de Ejecución	17/03/2021 13:54:45 p. m.
Autorizó 1:	ENOC GORDILLO ARGUELLO
Fecha Autorización 1:	17/03/2021 14:20:39 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6283



KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

RFC: KSC151218SS9
Carretera Angostura Km. 1 Sin número
C. P. 29169 Chiapa de Corzo, Chiapas
Teléfono: 011 985 42 80

SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MX.

CLIENTE
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
IIF060705F48
USO CFDI: P01 - Por definir
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, 650, Penipak, 29060, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Factura 9
FOLIO FISCAL (UUID)
753DA9C0-08A0-4903-91E4-391A6A8FD28E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503105076
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-03-10T09:54:47
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
SVT110323827
LUGAR DE EXPEDICIÓN
29169

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO

I - Ingreso
99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO
MONEDA

PPD - Pago en
parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: ID ARTICULO CLAVEPRODSE, CANTIDAD, UNIDAD CLAVEUNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Includes a large stamp: 'Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.'

Impuestos trasladados:

Table with 6 columns: Tipo Imp, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, base, Importe. Shows tax details for 'Trastado' with a 16.00% rate on a base of \$1,838,476.42.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QvJdhCbHkfyDhzz2fzxeT7I8+QBNLWW6dIW8DQmuTBz1N66BE9BKfYILWaWwj2vluObd4UMEV12ayN0vOIIAD7+MHPKbPGNFu+Y4LkgtIH
DmRMoSb6g9r8S1EPCc7pSf7CLJtby/BI.846BpXR2dUnqwB5TVEU7L05s6DbJ0KunWFzylHmQcKHiAG8I0h1KAms0q9RN3nHmws6EVG27W
9Rvjl8p4DsMP//MNRZBEfuzYT GwInCfdVNICDQAKT7007SMf9czJpLmBx7QHmJl0uJ8q8tqpcAR84nGBWdclXpa0nyh4DlM0hQEGig9D/HDOA
RIOPZ6EafcvTE7A==


SELLO DEL SAT

OaDm3f+opmC5YDLjv6z1+OQliB3V87x9TEHNDxUvu8koL67JRnPJKEoHom8QBd3mtC7jnepf74flivvFcdGgAkI8MdN1qqmQnc+JdJ
YMsQ9uueorENB4PIJFGOWCLwAxlFFOmOAZj6JhYXzOKXpAZiGd5xSD24qvO+/zHLWFedU2TXZacVWpPU4bpbKZSRAYpET5D
zFeKpmRyNR4DLkbrKvP49KXDU5RAIbOTzKAg7yNjflbfoW6rCvddOFEKLI7bzhuZwh4MA5jmduv1P3+5CyLe1M060/RFee7Sy87
NXnWRR2LLYgh/WYyb7DY2Im+Ggj31DFs6gY2EIGjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|753DA9C0-08A0-4903-91E4-391A6A8FD28E||2021-03-
10T09:54:47|SVT110323827|QvJdhCbHkfyDhzz2fzxeT7I8+QBNLWW6dIW8DQmuTBz1N66BE9BKfYILWaWwj2vluObd4UMEV12ayN0vOIIAD
7+MHPKbPGNFu+Y4LkgtIH DmRMoSb6g9r8S1EPCc7pSf7CLJtby/BI.846BpXR2dUnqwB5TVEU7L05s6DbJ0KunWFzylHmQcKHiAG8I0h1KA
ms0q9RN3nHmws6EVG27W9Rvjl8p4DsMP//MNRZBEfuzYT GwInCfdVNICDQAKT7007SMf9czJpLmBx7QHmJl0uJ8q8tqpcAR84nGBWdclXpa
0nyh4DlM0hQEGig9D/HDOARIOPZ6EafcvTE7A==|00001000000413073350|





INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION FISICA EDUCATIVA

ESTADO DE CUENTA

CÓDIGO: EST-001-001-004

Página 1 de 1

OTRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS Y OY OTRA ENTORNEN EN LA SEDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION

LOGARDO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
 MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
 CONTRATISTA: MASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.  
 FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 FECHA DE TERMINO SEGUN DISCRECIONARIO:

No. DE CONTRATO: 20412001-057  
 MONTO CONTRATADO CIVA: 65,212,382.25  
 ANTIPO CIVA: 33,653,714.76  
 NO. DE ESTIMACION: 01 JUNIO  
 FECHA DE ELABORACION: 28 DE ENERO DE 2021  
 PERIODO DE EJECUCION: DEL 04/01/2021 AL 28/01/2021

AVANCE FÍSICO ACUMULADO:  
 AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACION:  
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:  
 AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACION:


ACTIVA No	ESTIMACION No	PERIODO	ESTIMACION						RETENCIONES								
			AMORTIZACION CIVA	RETENCION	PERMISION	SANCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	16 OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	3.1% ADICIONALES AL I.C.T.C.	0.5% INSURACION Y VIGILANCIA SIA	16 POR ADICIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	3 EN SOBRE NORMA	CONTRIBUCION ADICIONAL AL I.M.	TOTAL RETENCIONES LIQUIDAS A PAGAR	
8	ANTICIPO		11,770,443.76				11,770,443.76	1,889,271.00	13,659,714.76								
9	01 UNO: DEL 04/01/2021 AL 28/01/2021		\$2,626,394.88	\$787,918.46	\$0.00	\$0.00	\$1,838,476.42	\$204,158.23	\$2,042,634.65	\$26,263.95	\$5,252.79	\$13,131.97	\$78,791.85	\$5,787.34	\$147.24	\$12,645.14	\$2,003,057.11
<b>TOTALES</b>			2,626,394.88	787,918.46	0.00	0.00	1,838,476.42	294,156.23	2,132,632.65	26,263.95	5,252.79	13,131.97	78,791.85	5,787.34	147.24	12,645.14	2,003,057.11
SALDO POR EJECUCION CIVA			\$42,465,764.49			\$42,465,764.49											

ELABORO:  
 C. MOISES SANCHEZ SANTOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

MASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.

REVISO:  
 ARQ. ELARITZA CARMINA FORZO FERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION  
 ZONA NOROCCIDENTAL



INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RESUMEN FÍSICO - FINANCIERO

Código: RES-DIC-DCYE-003

Revisión: 06

Página 1 de 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

FECHA DE ELABORACION  
CONTRATO No  
2042001-057  
MONTA CONTRATADO C/IV.A.  
\$45,512,382.55  
CONVENIO DE AMPLIACION  
N/A  
MONTO DEL CONVENIO  
N/A  
MONTO DE ANTICIPO C/IV.A.  
\$13,653,714.76  
MANO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO  
\$4,322,753.81  
MANO DE OBRA GRAVABLE DE CONVENIO  
ESTIMACION No  
01(UNO)

PERIODO CONTRATADO  
PERIODO DIFERIMIENTO  
04 DE ENERO DE 2021 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
PERIODO DE SUSPENSION TEMPORAL  
N/A  
FECHA DE REPROGRAMACION  
N/A  
N/A

ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
\$45,512,382.55	\$45,512,382.55	\$45,512,382.55
\$0.00	\$3,046,618.06	\$3,046,618.06
\$45,512,382.55	\$42,465,764.49	\$42,465,764.49
\$13,653,714.76	\$13,653,714.76	\$13,653,714.76
\$0.00	\$913,985.41	\$913,985.41
\$13,653,714.76	\$12,739,729.35	\$12,739,729.35
\$0.00	\$26,263.95	\$26,263.95
\$0.00	\$5,252.79	\$5,252.79
\$0.00	\$13,131.97	\$13,131.97
\$0.00	\$78,791.65	\$78,791.65
\$0.00	\$5,787.34	\$5,787.34
\$0.00	\$347.24	\$347.24
30.00%	4.69%	34.69%
0.00%	6.69%	6.69%

ELABORO  
C. MOISES SANCHEZ SANTOS  
ADMINISTRADOR UNICO  
KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.

REVISADO  
ARACELI GUARITZA CARMINA CORZO FERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

Vc. Bo.  
ING. CESAR JONATAN SALAZAR OZUNA  
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

Vc. Bo.  
ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NOROCCIDENTAL

Vc. Bo.  
ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ REYES  
DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/05/2021 16:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1124821755 ✓
Nombre del Ordenante	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC o CURP del Ordenante	IIF080705F48
Moneda	MXP
ID Tercero	65505470300
Nombre del Beneficiario	KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, ✓ S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	014100655054703005
RFC Beneficiario	KSC151218SS9
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$4,254,631.91 ✓
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/05/2021
Número de Referencia	14
Propósito de la Transferencia	EST 02 F14 CO2042001-057
Clave de Rastreo	8846APR1202105031281633373
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ
Fecha Captura	03/05/2021 16:11:21 p. m.
Ejecutó	LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS
Fecha de Ejecución	03/05/2021 16:14:41 p. m.
Autorizó 1:	ENOC GORDILLO ARGUELLO
Fecha Autorización 1:	03/05/2021 16:16:49 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



**KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A.**

RF C: KISC 1512185538  
Carretera Anepatura Km 1.5 SANSA, Sabalzar Urbina, 29169, Chianpas de Corzo, Chiapas de Corzo, Chiapas, México

Tel. 961 135 67 80

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.**

IF080705F48

USO CFDI: P01 - Por definir

LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, 650, Penipak, 29060, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

**Factura 14**

FOFIO FISCAL (UJED)

730850SD-458F-4755-A071-08885185AF0B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503105076

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-04-29T12:34:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-04-29T12:24:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29169

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO

I - Ingreso  
99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano

ID ARTICULO CLAVEPRODSER y	CANTIDAD	UNIDAD CLAVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	1	E68 Unidad de Servicio	RECIBI: DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CANTIDAD DE \$4,277,702.81 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.02 (DOS), PERIODO DEL 29 DE ENERO DE 2021 AL 27 DE FEBRERO DE 2021, DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (BYC) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION LA CUAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE: SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CON NUMERO DE CONTRATO: 2042001-057 DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2020, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$45,512,382.56 (CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.	\$ 5,268,106.92	\$1,580,432.08	\$5,268,106.92
			(*) IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS)			\$ 5,268,106.92
			(-) 30 % AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 1,580,432.00
			(-) RETENCIÓN			\$ 0.00
			(+) DE DEDUCCIÓN			\$ 0.00
			(-) SANCION			\$ 0.00
			(-) 16% I.V.A.			\$ 842,911.92
			<b>SUBTOTAL</b>			\$ 3,687,674.84
			<b>TOTAL</b>			\$ 4,277,702.81
			(*) DEVOLUCION DEL 3% APORTACION P/EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES			\$ 128,130.36
			(-) RETENCIONES			\$ 0.00
			1% DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL			\$ 52,681.07
			0.2% DE APORTACIONES AL I.C.I.C.			\$ 10,536.21
			0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA			\$ 26,340.53
			2.0% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA			\$ 11,608.43
			6% POR CONTRIBUCION ADICIONAL AL ISN			\$ 696.51
			<b>ALCANCE LIQUIDO</b>			\$ 101,862.75
			CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 91/100 MXN			\$ 4,254,631.91
			OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO SH/SUBE/3152/2020, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y SH/SUBE/0009/2021 DE FECHA DE 21 DE ENERO DE 2021			
			RECIBI EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LA FECHA DEL 29 DE ABRIL DE 2021			
			RECIBI:			
			KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V. C. MOISES SANCHEZ SANTOS ADMINISTRADOR UNICO			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.

**Impuestos trasladados:**

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	base	Importe
Trasladado	002	Tasa	16.00%	\$3,687,674.84	\$590,027.97

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ceJDTRHa2OqfLaAm7aIS9AqBQgQqLqUX5qjpbZNYtAOoPRIMS8oWnkSw5UIEzOjakKF/Rjv9YjOBIHNIH0DIM3b/UntaIS/VStal0pkjLuzwiSFRrBYRkMhOquzB/EnkMqOWEB+Tp6kdSzkGlr8MwwBjw0YSVwTuETJ5OITSsNyaLQldgdkBq23UlxRdV2ZICteMwQOPJO8zL87hCIAGNvss64Ch8ZA4VNr9ggS3FzInkxNUe4v01kTQ5jnhn+0BMLIE7IK75h54OqwQ+GPOnLAdVREVMl6cCfKJoUemIHOAQIT6c9lCwWBP7rSARIRYpku137d7p==

**SELLO DEL SAT**

DNDpD++CdgEUHKnoOmaODwNM6WNVJ8U/FzinYmdSB6NA4lp1FRVKgt5Bl6SCc60YmL6NtwE/hqDhH0xDsvtOnJ/ZHmlS/vhdDFI6VcbEXL.ayqRcUtyfRZowbnhH5jKKSPrgruL3yPwmzow2/LegUpZDLNMHIKYSzfdLbWrr+U0YvocN2T8hFI0YnZ9OBgcMUaU6IEtKEQM6qqAidWLDz+ne1oYYNIXH6coEeA9u2teBrwVR0nRkyvrl7V98aRTMSu7+cdTWWU+K7Ad0OxI/F7M4Ak3IBOvRbUDBcJOHVCZ9E97e4Wz4Cx1HDS+3xt.G9O9Zy14EE682MGISQja==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

ff1-4730850SD-458F-4755-A071-08885185AF0B|2021-04-29T12:34:51|SVT110323827|9611356780|KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V. C. MOISES SANCHEZ SANTOS ADMINISTRADOR UNICO|00001000000413073350|00001000000503105076|I-99|MXN|5268106.92|1580432.08|5268106.92|72121406|E68|1|RECIBI: DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CANTIDAD DE \$4,277,702.81 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.02 (DOS), PERIODO DEL 29 DE ENERO DE 2021 AL 27 DE FEBRERO DE 2021, DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (BYC) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION LA CUAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE: SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. CON NUMERO DE CONTRATO: 2042001-057 DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2020, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$45,512,382.56 (CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO.



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERIA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSTITUCIÓN DE TORREONES Y OBRAS EXTERNAS EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA FASE DEL PLAN MAESTRO DE OBRAS

UBICACIÓN: SAN JUAN, CIUDAD DE LAS CASAS, CHIAPAS

MONTO CONTRACTADO: \$15,532,385.85

ANTICIPO CIVIL: \$3,893,734.76

NO DE ESTIMACIÓN: 02 (005)

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/01/2021 AL 31/03/2021

AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 20.17%

AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN: 13.43%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 44.09%

AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACIÓN: 9.40%

PERIODO	ESTIMACIÓN										RETRIBUCIONES				
	IMPORTE CIVIL	AMORTIZACIÓN CIVIL	REVENIDO	DEVOLUCIÓN	SANCIÓN	SUPERVAL	IVA	TOTAL	IMPORTE DE BIENEFICIO SOCIAL	IMPORTE DE BIENEFICIO PMP					
01	\$11,770,443.76	\$787,918.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,770,443.76	\$1,863,271.00	\$13,633,714.76	\$26,263.85	\$13,131.97	\$4,252.79	\$5,787.34	\$347.24	\$129,375.44	\$2,853,714.76
02	\$5,268,106.82	\$1,560,432.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828,539.50	\$580,027.37	\$7,408,566.87	\$52,681.07	\$28,340.53	\$10,335.21	\$11,808.03	\$686.51	\$101,982.75	\$2,005,057.51
TOTALES	7,894,501.90	2,368,350.54	0.00	0.00	0.00	10,262,852.44	2,443,298.37	12,706,150.81	78,944.92	38,472.50	15,587.00	17,595.37	1,043.75	231,358.19	4,858,772.27

REVISADO: ARQ. CLARITZA CARUMBA FERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

REVISADO: ING. VICTOR MANUEL SINGO MARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

CON: II NGITE - ALTOS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

RESUMEN FISICO - FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA ACADÉMICA, INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
 MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

FECHA DE ELABORACION: 27 DE FEBRERO DE 2021  
 CONTRATO No: 2042801-057  
 MONTO CONTRATADO C.I.V.A.: \$45,512,382.55  
 CONVENIO DE AMPLIACION: N/A  
 MONTO DEL CONVENIO: N/A  
 MONTO DE ANTICIPO C.I.V.A.: \$13,653,714.76  
 MANO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO: \$4,322,753.51  
 MANO DE OBRA GRAVABLE DE CONVENIO: N/A  
 ESTIMACION No: 02 (DCS)

*Este programa es público,  
 ajeno a cualquier partido político.  
 Queda prohibido el uso para  
 fines distintos a los  
 establecidos en el programa*

CONTRATO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUM. ADO
ESTIMADO	\$45,512,382.55	\$45,512,382.55	
POR ESTIMAR	\$3,046,618.06	\$6,111,004.03	\$9,157,622.09
ANTICIPO	\$42,465,764.49	\$36,354,750.46	\$35,354,750.46
AMORTIZADO	\$13,653,714.76	\$13,653,714.76	\$13,653,714.76
POR AMORTIZAR	\$913,985.41	\$1,833,301.22	\$2,747,286.63
	\$12,739,729.35	\$10,906,423.13	\$10,906,423.13
EN LAS OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL	\$52,263.95	\$52,263.97	\$78,945.02
SE CANCELACIONES AL I.C.I.C.	\$5,262.79	\$10,536.51	\$15,769.00
SEMPRE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMENDAN A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y FUNCION PUBLICA	\$13,131.97	\$26,340.63	\$39,472.50
EN APORTACION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	-\$78,791.85	\$78,791.65	\$0.00
2.0% IMPUESTO SOBRE PAZO DE NOMINA	\$5,787.34	\$11,608.43	\$17,395.77
5.0% CONTRIBUCION ADICIONAL AL ISH	\$347.24	\$698.51	\$1,043.75
AVANCE FINANCIERO (%)	34.69%	9.40%	44.09%
AVANCE FISICO (%)	6.65%	13.43%	20.12%

ELABORO: C. MOISES SANCHEZ SANTOS  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.

REVISO: ARQ. GLARITZA GABRIELA CORZO FERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. CESAR JONATHAN SALAZAR OZUNA  
 DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NOROCCIDENTAL

ING. LUIS ALBERTO PONZALEZ REYES  
 DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

14/06/2021 15:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	1124821755 ✓
Nombre del Ordenante	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC o CURP del Ordenante	IIF080705F48
Moneda	MXP
ID Tercero	65505470300
Nombre del Beneficiario	KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, ✓ S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	014100655054703005
RFC Beneficiario	KSC151218SS9
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,431,254.98 ✓
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/06/2021
Número de Referencia	15
Propósito de la Transferencia	EST 03 F15 CO2042001-057
Clave de Rastreo	8846APR1202106141322920602
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ
Fecha Captura	14/06/2021 14:55:50 p. m.
Ejecutó	LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS
Fecha de Ejecución	14/06/2021 15:17:18 p. m.
Autorizó 1:	ENOC GORDILLO ARGUELLO
Fecha Autorización 1:	14/06/2021 15:43:30 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



**KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.**

Carretera Tapachula-Tuxtla Gutierrez  
C. P. 29169 Chiapa de Corzo, Chiapas  
Tel: 961 135 67 80  
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RIF: 080705F48  
USO CFDI: P01 - Por definir  
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, 650, Panipak, 29060, Tuxtla Gutierrez, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México

Factura 15

FOURTO FISCAL (RUBRO):

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000503105076

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-06-03T16:56:41  
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2021-06-03T16:38:52  
LUGAR DE EXPEDICION: 29169

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO:  
MONEDA:

PPD - Pago en parceladas o diferido  
MXN - Peso Mexicano

ID AUTORIZADO CLAVEPRODESE RY	CANTIDAD	UNIDAD CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas	1	C48 Unidad de Servicio	RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CANTIDAD DE \$2,490,561.45 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.) CON FINANCiado, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES), PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 AL 14 DE MARZO DE 2021, DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION LA CUAL SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CON NUMERO DE CONTRATO: 2042001-057 DE FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2020, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$45,512,382.55 (CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO	\$3,067,193.90	\$920,159.17	\$3,067,193.90
(+) IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) (-) 30 % AMORTIZACION DEL ANTICIPO (-) RETENCION (+) DEVOLUCION (-) SANCION						\$ 3,067,193.90 \$920,159.17 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL						\$ 2,447,035.73
TOTAL						\$ 343,525.72
(+ ) 16% I.V.A.						\$ 2,490,561.45
(-) RETENCIONES 1% DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL 0.2% DE APORTACIONES AL I.C.I.C. 0.5% POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA 2.0% IMPUESTO SOBRE PAGO DE NOMINA 6% POR CONTRIBUCION ADICIONAL AL ISR						\$ 30,671.94 \$ 6,134.39 \$15,335.97 \$6,758.05 \$405.52
ALCANCE LIQUIDO						\$ 59,306.47
[DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 98/100 MXN) OFICIO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NUMERO SH/SUBE/3152/2020, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL INIFECH-UNICH DE FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. RECIBI EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LA FECHA DEL 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021						\$ 2,431,254.98

Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.

RECIBI:  
*Miguel*  
KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.  
C. MOISES SANCHEZ SANTOS  
ADMINISTRADOR UNICO

Impuestos trasladados:

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Trasladado	002	Tasa	10.00%	\$2,147,035.73	\$343,525.72

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TuelQIXkFgo174xdJug3L0sbd1Kb/AyKqYnB84CSJwh+SjOdlc2NL3mUfTK29k+Ik51bRBXDFoAHPXaWjczox56Vh1IKohfrN8xVoWOCyFvUhlwzuN4cfaJvgSK41y2A/MBTE35uak4WJ6KNeFYolBZ2dPe9JTK7TzMLXPicbOgZrcOTMnAq5b5i8LnZspHbGIDXTcDdsifumaKc6pLcPOmlqfrvm0orr+M0PucM3qKMKUhiCvGHNS6EhSUIfOnQBdGnbZdr57Gf5legzfnbdaUJP2nyQfnc38VVRFR0rMzQODuIMyYLLr7SdyKRW2k81tkPALy8A==

SELLO DEL SAT

c87cZkr8O96qYHOjaTRMA0IcOouL4fn1SLpLHBsqRTSYnc5D7kYrSJR2vWfHISnszdlLOZgZZXIGpCuX4NWDUpX8EOXIaB1ZxDITEHins8Jw6jYP9EscgJvD6vbxHUA0/5H7JkgIGuNDSoIMShLZPucVowXtubU20zhgmBYBkoX.HJprJyA7q6kQqwwLdRMWpDob97/OQG+PuUCJlMYYIYIPMaquaG91qUAlk774LS9CngdwdwdfAfpjogp3DomeCOUJEX8v84z7UhgM1HjpyJahyQoIB1R/XQ4vAXPyPmdMPIZEaV1YIHgHmgBRIQ5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1JA9CCB32-921D-4318-B6FB-1C3AD1386345|2021-06-03T16:58:41|SVT110323827|TuelQIXkFgo174xdJug3L0sbd1Kb/AyKqYnB84CSJwh+SjOdlc2NL3mUfTK29k+Ik51bRBXDFoAHPXaWjczox56Vh1IKohfrN8xVoWOCyFvUhlwzuN4cfaJvgSK41y2A/MBTE35uak4WJ6KNeFYolBZ2dPe9JTK7TzMLXPicbOgZrcOTMnAq5b5i8LnZspHbGIDXTcDdsifumaKc6pLcPOmlqfrvm0orr+M0PucM3qKMKUhiCvGHNS6EhSUIfOnQBdGnbZdr57Gf5legzfnbdaUJP2nyQfnc38VVRFR0rMzQODuIMyYLLr7SdyKRW2k81tkPALy8A==|00001000000413073350||



Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa.



**RESUMEN FÍSICO - FINANCIERO**

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
 MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

FECHA DE ELABORACION: 14 DE MARZO DE 2021  
 CONTRATO NO: 2042001-057  
 MONTO CONTRATADO CIVIL: \$45,512,382.55  
 CONVENIO DE AMPLIACION: N/A  
 MONTO DEL CONVENIO: N/A  
 MONTO DE ANTICIPO CIVIL: \$13,653,714.76  
 MANO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO: \$4,322,753.81  
 MANO DE OBRA GRAVABLE DE CONVENIO: N/A

ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
\$45,512,382.55	\$45,512,382.55	\$45,512,382.55
\$9,157,622.09	\$3,557,944.92	\$12,715,567.01
\$36,354,760.46	\$32,796,815.54	\$32,796,815.54
\$13,653,714.76	\$13,653,714.76	\$13,653,714.76
\$2,747,286.63	\$1,067,383.47	\$3,814,670.10
\$10,906,428.13	\$9,839,044.66	\$9,839,044.66

\$78,945.02	\$30,671.94	\$109,616.96
\$15,789.00	\$6,134.39	\$21,923.39
\$39,472.50	\$15,335.57	\$54,808.47
\$17,395.77	\$6,758.65	\$24,154.42
\$1,043.75	\$405.52	\$1,449.27

44.09%	5.47%	49.56%
20.12%	7.82%	27.94%

**ELABORO**  
 C. MOISES SANCHEZ SANTOS  
 ADMINISTRADOR JUNCO  
 KASTO INCLUCIONES EN CONSTRUCCION ACABADOS MX, S.A. DE C.V.

**REVISO**  
 ARQ. GLARITZA GARCINA CORZO FERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

**V.O. BO.**  
 ING. CESAR JONATHAN SALAZAR OZUNA  
 DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

**V.O. BO.**  
 ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ REYES  
 DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

**V.O. BO.**  
 ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION  
 ZONA NOROCCIDENTAL



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

24/06/2021 15:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	1124821755
Nombre del Ordenante	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC o CURP del Ordenante	IIF080705F48
Moneda	MXP
ID Tercero	65505470300
Nombre del Beneficiario	KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE/Celular	014100655054703005
RFC Beneficiario	KSC151218SS9
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,148,990.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/06/2021
Número de Referencia	16
Propósito de la Transferencia	EST 04 F16 CO2042001-057
Clave de Rastreo	8846APR2202106241333775741
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ
Fecha Captura	24/06/2021 14:51:20 p. m.
Ejecutó	LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS
Fecha de Ejecución	24/06/2021 15:21:27 p. m.
Autorizó 1:	ENOC GORDILLO ARGUELLO
Fecha Autorización 1:	24/06/2021 15:24:08 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MX.

KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V.

RFC: KSC151216SS9
CARRETERA ANGOSTURA KM 1, S/N/S/N, SALVADOR URBINA, 29169, CHIAPAS DE CORZO, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, MÉXICO

Tel: 951 135 57 00
REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

IIF080705F48

USO CFDI: P01 - Por definir

LIBRAMIENTO SUR PONIENTE. 650, Penipak, 29060, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Factura 16

FOLIO FISCAL (UUID)

96C2831B-7879-4683-B9CA-AE24933C.C008

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503105076

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-06-18T14:18:53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-06-18T13:58:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29169

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO

I - Ingreso
99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO
MONEDA

PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: ID ARTICULO CLAVEPRODSER, CANTIDAD, UNIDAD CLAVEUNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Includes item details for construction services and a summary table for SUBTOTAL, TOTAL, and ALCANCE LIQUIDO.

Impuestos trasladados:

Table with 6 columns: Tipo Imp, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, base, Importe. Shows tax details for 'Traslado' with a rate of 16.00% and a base of \$1,897,768.52.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BYF5GcjABAVV6QHvZxNyTNSg7TwnBz0Utr005z99j0zmTn6ZAtqyNDTE7vAcGgqOP5cnYKksQawSazCLuv26Pmt1p7619hY5zbcjaokjZBLP0...

SELLO DEL SAT

A2laQ8HWfd65pynooURedJ581TvderySR/D4RLnP0f+006mleALKXVfmu56X423PeMI8dCinQX+es2dpyC+YdAbiwbyv+2lJZC4o5j/...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|96C2831B-7879-4683-B9CA-AE24933C.C008|2021-06-18T14:18:53|SV1110323827|BYF5GcjABAVV6QHvZxNyTNSg7TwnBz0Utr005z99j0zmTn6ZAtqyNDTE7vAcGgqOP5cnYKksQawSazCLuv26...



ESTADO DE CUENTA

Código: EST-DIC-DCYE-004

Revisión de

Página 1 de 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL  
 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE TIPO C Y OBRA EXTERIOR EN LA SDE CENTRAL CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE  
 CONSTRUCCIÓN

ESTADO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
 MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
 GOBIERNO: MASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.  
 FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DE 2021  
 FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 FECHA DE ANÁLISIS Y FORTALECIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 SUPERVISIÓN: (Firma)

Nº. DE CONTRATO: 2020001-052  
 MONTO CONTRATADO CIVA: 46,532,822.55  
 ANTICIPO CIVA: 13,633,744.76  
 NO. DE ESTIMACIÓN: 04 (CUATRO)  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 15/02/2021 AL 31/03/2021

AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 34.85%  
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 6.91%  
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 54.40%  
 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 4.68%

FACTURA No.	ESTIMACIÓN No.	PERIODO	ESTIMACIÓN										RETENCIONES					RENTAS Y PAGAR
			AMORTIZACIÓN SIVA	INTERCIÓN	DEVOLUCIÓN	SANCIÓN	PAUTAL	IVA	TOTAL	EN OTRAS DE INGRESOS SOCIALES	0.3% APORTACIÓN AL ICAEC	EN IMPORTE Y VOLUMEN SIVA	3% POR APORTACIÓN POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1% SOBRE NOMINA	6% CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL AL ICA	TOTAL RETENCIONES	RENTAS Y PAGAR	
9	ANTICIPO		\$11,770,443.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,770,443.76	\$1,683,271.00	\$13,653,714.76	\$28,263.95	\$5,252.79	\$13,131.97	\$78,791.85	\$347.24	\$128,575.14	\$0.00	\$13,653,714.76	
9	01 (UNO)	DEL 04/01/2021 AL 28/01/2021	2,626,394.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,475.42	\$284,156.23	\$2,123,631.65	\$28,263.95	\$5,252.79	\$13,131.97	\$78,791.85	\$347.24	\$128,575.14	\$0.00	\$2,000,057.51	
14	02 (DOS)	DEL 29/01/2021 AL 27/02/2021	5,268,106.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,697,674.64	\$590,027.97	\$4,277,702.61	\$32,691.07	\$10,506.21	\$29,440.53	\$0.00	\$698.51	\$101,862.75	\$76,791.85	\$4,254,631.91	
15	03 (TRES)	DEL 28/02/2021 AL 14/03/2021	2,067,193.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,635.73	\$343,525.72	\$2,490,561.45	\$30,671.94	\$6,134.39	\$15,335.97	\$6,756.65	\$405.62	\$69,306.47		\$2,431,264.98	
16	04 (CUATRO)	DEL 15/03/2021 AL 31/03/2021	\$2,711,087.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897,766.52	\$303,942.96	\$2,201,411.48	\$27,110.98	\$5,422.20	\$13,555.49	\$5,973.98	\$358.44	\$52,421.09		\$2,146,990.39	
<b>TOTALES</b>			\$13,672,783.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570,954.51	\$1,531,352.88	\$11,102,308.39	\$136,727.94	\$27,345.59	\$69,363.96	\$78,791.85	\$30,284.40	\$343,165.45	\$78,791.85	\$10,837,837.79	
SALDO POR AMORTIZAR CIVA: \$8,895,582.66																		

ELABORÓ:  
 C. MOISÉS SANCHEZ SANTOS  
 ADMINISTRADOR ÚNICO  
 KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V.

REVISÓ:  
 ARQ. GLARITZA CARMINA CORZO FERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

Visto:  
 INGENIERO MANUEL NIÑO MARTINEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  
 ZONA NOROCCIDENTAL

OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS (B Y C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SEDE CENTRAL, CUARTA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCION

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
MUNICIPIO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2021  
CONTRATO No: 2042001-057  
MONTO CONTRATADO C.I.V.A.: \$45,512,382.55  
CONVENIO DE AMPLIACION: N/A  
MONTO DEL CONVENIO: N/A  
MONTO DE ANTICIPO C.I.V.A.: \$13,653,714.76  
MONTO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO: \$4,322,753.81  
MONTO DE OBRA GRAVABLE DE CONVENIO: 04 (CUATRO)

INICIO	TERMINO	ACUMULADO
04 DE ENERO DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$45,512,382.55
N/A	N/A	\$15,860,440.55
N/A	N/A	\$29,651,942.00
N/A	N/A	\$13,653,714.76
N/A	N/A	\$4,758,132.16
N/A	N/A	\$8,895,582.50
N/A	N/A	\$7,110.98
N/A	N/A	\$5,422.20
N/A	N/A	\$13,555.49
N/A	N/A	\$5,973.96
N/A	N/A	\$358.44
N/A	N/A	49.56%
N/A	N/A	27.94%
N/A	N/A	4.84%
N/A	N/A	6.91%
N/A	N/A	54.40%
N/A	N/A	34.85%

ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
\$45,512,382.55	\$45,512,382.55	\$45,512,382.55
\$12,715,567.01	\$3,144,873.54	\$15,860,440.55
\$32,796,815.54	\$29,651,942.00	\$29,651,942.00
\$13,653,714.76	\$13,653,714.76	\$13,653,714.76
\$3,814,670.10	\$943,462.06	\$4,758,132.16
\$9,839,044.66	\$8,895,582.50	\$8,895,582.50
\$109,616.96	\$27,110.98	\$136,727.94
\$21,923.39	\$5,422.20	\$27,345.59
\$54,803.47	\$13,555.49	\$68,358.96
\$24,154.42	\$5,973.96	\$30,128.40
\$1,449.27	\$358.44	\$1,807.71
49.56%	4.84%	54.40%
27.94%	6.91%	34.85%

ELABORO: C. MOISES SANCHEZ SANTOS ADMINISTRADOR UNICO  
KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX. S. A. DE C.V.

REVISOR: ARO GLARITZA CARMINA GORZO FERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES  
ING. CESAR JONATHAN SAZAR OZUNA DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

Vo. Bo. ING. VICTOR MANNUEL NIÑO MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA AL NORTE ALTOS

Vo. Bo. ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ REYES DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

FECHA DE EMISION: 27 DE JUNIO DE 2019




INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL (UNICH)	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V.
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	<b>No. DE CONTRATO:</b>	2042002-076
<b>MUNICIPIO:</b>	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$125,000.00
		<b>META:</b>	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

### REPORTE FOTOGRAFICO (DESPUES)

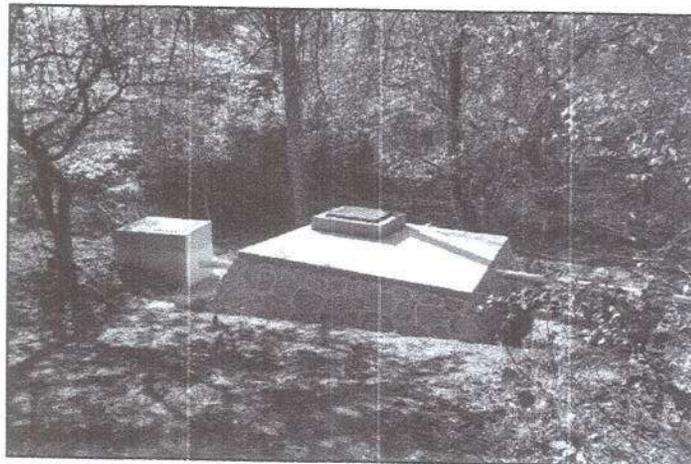

ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS



INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS

**OBRA:** CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y  
COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL  
(UNICHI)

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A  
DE C.V.

**LOCALIDAD:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

**No. DE CONTRATO:**

2042002-076

**MUNICIPIO:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS


**MONTO DE CONTRATO:**

\$125,000.00

**META:**

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y  
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

### REPORTE FOTOGRAFICO (DURANTE)

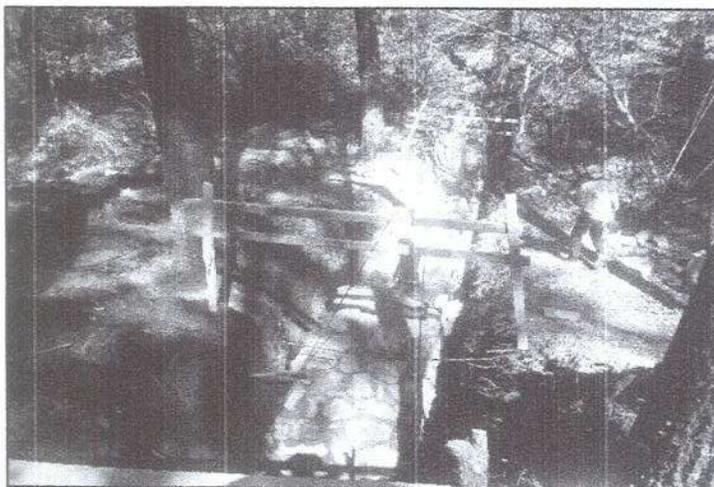

ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS





INSTITUTO  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA INSTITUCIONAL (UNICH)	<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A DE C.V.
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	<b>No. DE CONTRATO:</b>	2042002-076
<b>MUNICIPIO:</b>	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$125,000.00
		<b>META:</b>	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA

### REPORTE FOTOGRAFICO (ANTES)

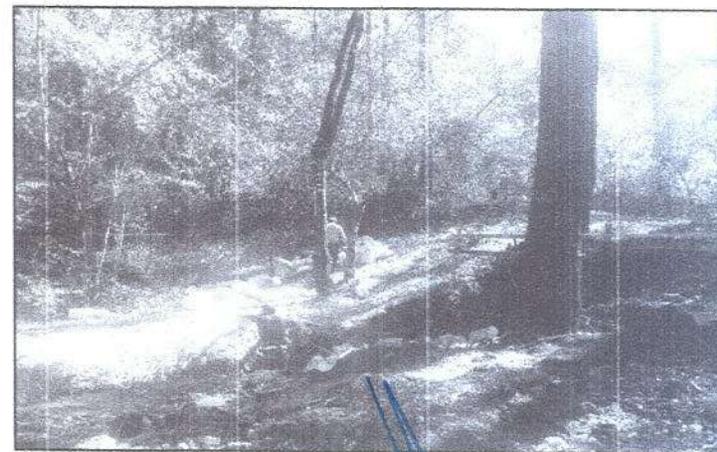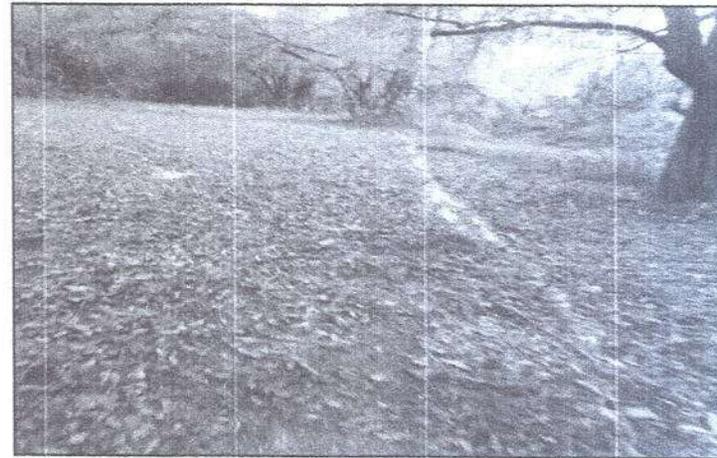

ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA II NORTE-ALTOS

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

09/04/2021 16:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	1124821755 ✓
Nombre del Ordenante	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC Ordenante	IIF080705F48
Moneda	MXP
ID Tercero	0882770530
Nombre del Beneficiario	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE ✓
Cuenta/ CLABE Beneficiario	S.A. DE C.V
Titular de la Cuenta	0882770530
RFC Beneficiario	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
Importe a Transferir	CEM130111RD9
IVA	\$75,257.97 ✓
Fecha Aplicación	\$0.00
Número de Referencia	09/04/2021
Propósito de la Transferencia	437
Clave de Rastreo	EST 01 F437 CO2042002 076
Confirmación	21
Comisión	OK. OPERACION EFECTUADA
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	\$0.00
Fecha Captura	LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ
Ejecutó	09/04/2021 03:58:59 p. m.
Fecha de Ejecución	LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS
Autorizó 1:	09/04/2021 04:02:02 p. m.
Fecha Autorización 1:	ENOC GORDILLO ARGUELLO
Autorizó 2:	09/04/2021 16:07:58 p. m.
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
GOBIERNO DE CUBA

ESTADO DE CUENTA

Código: EST-DIC-OCYE-004

Revisión: 06

Página: 1 de 1

TRABAJO DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVIDAD  
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPACITACIÓN  
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA

NO. DE CONTRATO: 202203-075  
MONTO CONTRATADO CIVA: \$ 135.000,00  
ANTICIPA CIVA: \$ 37.500,00

NO. DE ESTIMACIÓN: 01 DE JUNIO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE FEBRERO DE 2022  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2021 AL 02 DE FEBRERO DE 2022

AVANCE FÍSICO ACUMULADO: 82,35%  
AVANCE FÍSICO ESTIMACIÓN: 82,35%  
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 95,23%  
AVANCE FINANCIERO ESTIMACIÓN: 95,23%

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE FEBRERO 2021  
FECHA DE TERMINACIÓN DEFERIDA: N/A  
FECHA DE TERMINACIÓN REPROGRAMADO: N/A

FECHA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTIMACIÓN						RETENCIONES								
			IMPORTE ESTIMADO CIVA	AMORTIZACIÓN CIVA	ATERCIÓN	DEDUCCIÓN	SANCION	SURTIDAL	NVA	TOTAL	DEBIDAS DE INTERÉS SOCIAL	RENTA Y PARTICIPACIÓN AL I.C.L.C.	DETERMINACIÓN DE VIGILANCIA I.P.P.	DEBIDO SOBRE MONEDA	IMPORTE CONTRIBUTIVO ADICIONAL AL I.P.P.	TOTAL RETENCIONES	IMPORTE A PAGAR
01/01/2021	01 DE FEBRERO DE 2021 AL 02 DE FEBRERO DE 2021		\$ 31.327,59	\$ 28.526,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.327,59	\$ 5.172,41	\$ 37.500,00	\$ 950,98	\$ 285,29	\$ 475,49	\$ 238,93	\$ 14,16	\$ 1.961,85	\$ 37.500,00
TOTAL			\$ 31.327,59	\$ 28.526,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.327,59	\$ 5.172,41	\$ 37.500,00	\$ 950,98	\$ 285,29	\$ 475,49	\$ 238,93	\$ 14,16	\$ 1.961,85	\$ 37.500,00
SALDO POR AMORTIZAR CIVA			\$ 54.406,79					\$ 54.406,79									

**«Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa»**

EX-ABORDO  
MIGUEL VICTOR RAMON EL NINO MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRAS  
ZONA II (ORTIZ Y CAJAL)

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA INSTITUCIONAL, CCTA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA.

**FECHA DE ELABORACION:** 02 DE FEBRERO DE 2021  
**CONTRATO No.:** 23-2002-075  
**MONTO CONTRATADO:** \$ 125,000.00  
**CONVENIO DE AMPLIACIÓN:** N/A  
**MONTO DEL CONVENIO:** N/A  
**MONTO DE ANTICIPO:** \$ 37,500.00  
**MONTO DE OBRAS GRABABLE DE CONTRATO:** DE OBRAS: N/A  
**ESTIMACION No.:** 01 (UNO)  
**INICIO:** 17 DE FEBRERO DEL 2021  
**PERIODO CONTRATADO:** N/A  
**PERIODO DIFERIMIENTO:** N/A  
**PERIODO REPROGRAMADO:** N/A  
**PERIODO DEL CONVENIO:** N/A

ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
\$ 0.00	\$ 110,314.03	\$ 110,314.03
\$ 125,000.00	\$ 14,685.97	\$ 14,685.97
\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00
\$ 0.00	\$ 33,094.21	\$ 33,094.21
\$ 37,500.00	\$ 4,405.79	\$ 4,405.79

0.00	\$ 475.49	\$ 475.49
0.00	\$ 950.98	\$ 950.98
0.00	\$ 285.29	\$ 285.29
0.00	\$ 235.93	\$ 235.93
0.00	14.16	\$ 14.16
30.00%	61.78%	91.78%
0.00%	88.25%	88.25%

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.**

**ELABORADO:** ARQ. EUGENIA MAGDALENO RAMOS  
**REVISOR:** ARQ. GLARITZA CARMINA CORZO FERNANDEZ  
**ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ**  
**ING. CESAR JONATHAN GALAZAR OZUNA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE COSTOS**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NOROCCIDENTAL**

**Yo. Bo.:**

**FECHA DE EMISIÓN:** JUNIO 27 DE 2019



Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

23/04/2021 16:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	1124821755
Nombre del Ordenante	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC Ordenante	IIF080705F48
Moneda	MXP
ID Tercero	0882770530
Nombre del Beneficiario	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE S.A. DE C.V
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0882770530
Titular de la Cuenta	INIFECH RECURSOS FEDERALES CONV UNICH 2020
RFC Beneficiario	CEM130111RD9
Importe a Transferir	\$10,019.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/04/2021
Número de Referencia	438
Propósito de la Transferencia	EST 02F F438 CO2042002-076
Clave de Rastreo	22
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LEIDY CONSTANTINO MUÑOZ
Fecha Captura	23/04/2021 03:25:36 p. m.
Ejecutó	LILIANA KRISTELL OROZCO MACIAS
Fecha de Ejecución	23/04/2021 03:43:53 p. m.
Autorizó 1:	ENOC GORDILLO ARGUELLO
Fecha Autorización 1:	23/04/2021 16:09:21 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa"

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783





**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**RESUMEN FÍSICO - FINANCIERO**

Revisión: 06

Página 1 de 1

Código: RES-DIC-DC14-003

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA, INSTITUCIONAL Y CCT, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUBIA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

*Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el programa*

FECHA DE ELABORACION:	17 DE FEBRERO 2021
CONTRATO No.	304202017
MONTO CONTRATADO:	\$ 125,000.00
CONVENIO DE AMPLIACION:	N/A
MONTO DEL CONVENIO:	N/A
MONTO DE ANTICIPO:	\$ 37,500.00
MONTO DE OBRA GRAVABLE DE CONTRATO:	\$ 13,966.87
ESTIMACION No.:	02.F (DOS FIRMITOS)
INICIO:	04 DE ENERO DEL 2021
PERIODO CONTRATADO:	N/A
PERIODO DIFERIMIENTO:	N/A
PERIODO REPROGRAMADO:	N/A
PERIODO DEL CONVENIO:	N/A
TERMINO:	FEBRERO DEL 2021
ACUMULADO:	\$ 125,000.00

	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
	\$ 110,314.03	\$ 14,685.97	\$ 125,000.00
	\$ 14,685.97	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00
	\$ 33,094.21	\$ 4,405.79	\$ 37,500.00
	\$ 4,405.79	\$ 0.00	\$ 0.00
	475.49	\$ 63.30	\$ 538.79
	940.98	\$ 126.60	\$ 1,067.58
	285.29	\$ 37.98	\$ 323.27
	235.93	\$ 31.41	\$ 267.34
	14.18	1.88	\$ 16.06
	91.78%	8.25%	100.00%
	83.25%	11.75%	100.00%

ELABORO:

REVISO:

ING. GLARITZA CARMINA CORZO FERRANDEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. CESAR JONATAN SALAZAR OZUNA  
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS

ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA II NORTE ALTOS

ING. LUIS ALBERTO GONZALEZ REYES  
DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
