



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO
14 AGO 2019
12:57 PM
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de agosto de 2019

Oficio No. UNICH/CP/053/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de julio.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
14 AGO 2019
Hora: _____ Recibe: *Ady*
Secretaría Técnica
de la Oficina de la C. Secretaría
RECIBIDO - PLANTA BAJA

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGEU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de julio, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	julio 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Respetuosamente
15 AGO 2019
9:35 AM
RECIBIDO
COPIAS DE CONOCIMIENTO

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
09 AGO 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB
RECIBIDO
14 AGO 2019
Qua 1:39
COOPERACIÓN GENERAL
S.E.P. I.C.D.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
14 AGO 2019
14:41
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
14 AGO 2019
14:35
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

UNICH-SGC-F-03
Rev. 02 2019/02/01

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. (967) 63 161 52, 63
148 86, 63 148 88, Ext. 110, 132 y 145 www.unich.edu.mx

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Mes reportado

Julio

FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911-07MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obra de continuidad	Requerimiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional (Primera etapa).		X			\$ 996,798.85	\$ 996,798.85	-\$ 0.00			168m2	Se colocó la estructura metálica, con esta acción se da por concluida la Primera etapa de esta obra con el recurso FAM 2018.	Así mismo, en el mes de Agosto se comenzará la segunda etapa con la finalidad de concluir al 100% la obra con recursos del FAM 2019.	75%	24/12/18	31/07/19	Se esperara la culminación al 100% de la obra para entregar Actas Administrativas de Entrega - Recepción, reportando que la obra se ejecuto con recursos del FAM 2018 y FAM 2019.							
TOTAL									0	0.00														
TOTAL									0	0.00														

Dr. Jorge Luis Zuari-Maoriles
Titular de la JES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la JES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 2



Nombre de la obra: Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional



Porcentaje de avance

65%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

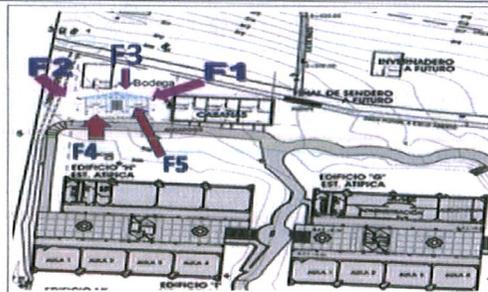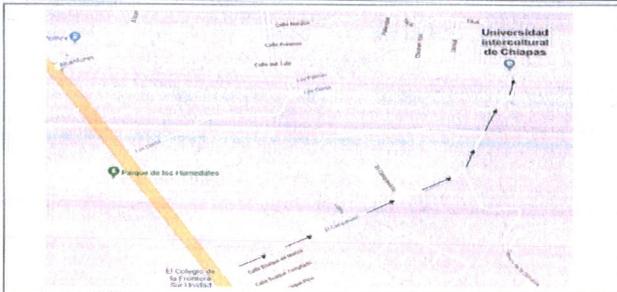


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

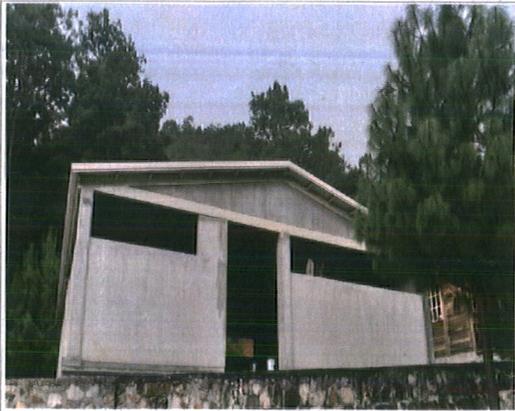

F1: Fachada principal

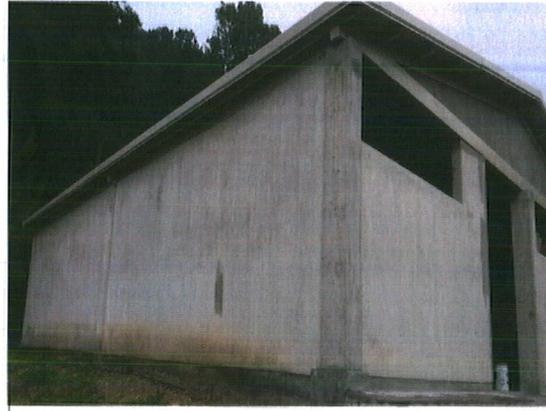

F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Se coloco la estructura metálica, con esta acción se da por concluida la Primera etapa de esta obra con el recurso FAM 2018.

Así mismo, en el mes de Agosto se comenzara la segunda etapa con la finalidad de concluir al 100% la obra con recursos del FAM 2019.

Dr. Jorge Luis Zuan Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
