



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO
09 ABR 2019
Ana 4:44
COORDINACIÓN GENERAL

RECIBIDO

09 ABR 2019

OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

UNICH Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de abril de 2019

Oficio No. UNICH/CP/027/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de marzo.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
10 ABR 2019
12:42
CD
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted para enviar el informe correspondiente al mes de marzo, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Marzo 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. (967) 63 161 52, 63
148 86, 63 148 88, Ext. 108 www.unich.edu.mx

RECIBIDO
09 ABR 2019
HORA: 17:56
Copias de Conocimiento

UNICH-SGC-F-03
Rev. 02 2019/02/01

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSLU008U

Nombre: C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext.132
Correo electrónico: planeacion@unisch.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext.132
Correo electrónico: planeacion@unisch.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuente con Actas				
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional	X				\$ 996,798.85	\$ 996,798.85	\$ 0.00			106m2	Se realizó la pavimentación del interior de la bodega, se repuso para cubrir muros y columnas, así como se construyeron grados para el acceso a la bodega, en los siguientes días colocaron la estructura metálica para el techado y con eso concluir con la Primera Etapa.		65%	24/12/18	14/06/19	Se gestionó el recurso con el programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, siendo como resultado aprobado para la terminación de la obra.							
TOTAL									0	0.00														
TOTAL									0	0.00														
						\$996,798.85	\$996,798.85	\$0.00																

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la ISS

C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la ISS

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, hitos que se van realizando en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

65%

PERIODICIDAD 2

Nombre de la obra: Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

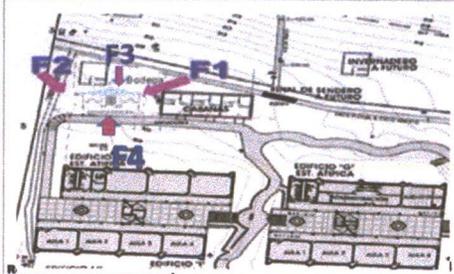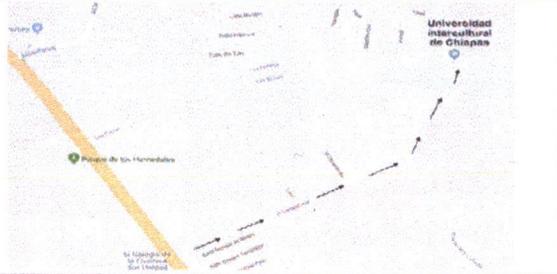


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS




F1: Fachada principal

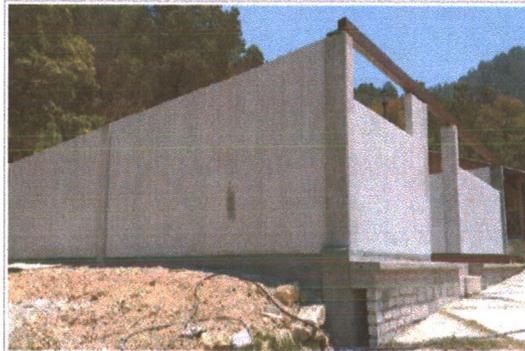

F2: lateral

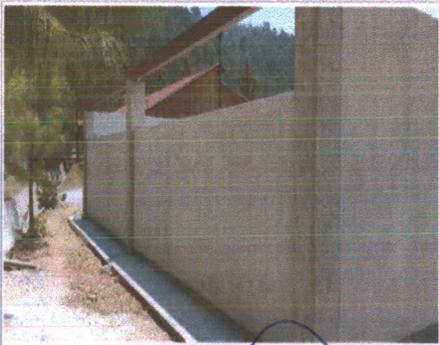

F3: Fachada posterior

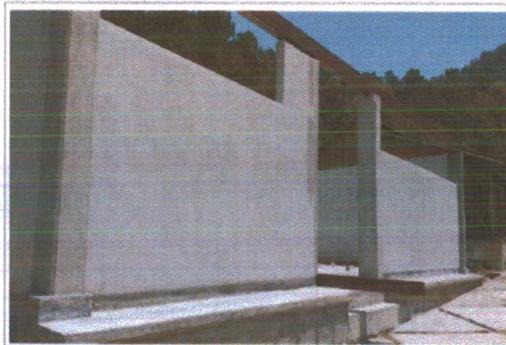

F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó la pavimentación del interior de la bodega, se repello para cubrir muros y columnas, así como se construyeron gradas para el acceso a la bodega, en los siguientes días colocaran la estructura metálica para el techado y con eso concluir con la Primera Etapa.

Dr. Jorge Luis Zuñiga Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Peña Guzmán
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello, se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
