

RECIBIDO
10 OCT 2018
11:54
E. MARTÍNEZ

copia c/2 regis
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
09 OCT 2018
18:09

14 SEP

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
09 OCT. 2018
HORA: 16:27 RECIBE: *Andrés*
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/97/2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Viernes 07 de septiembre de 2018

S.E.P. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
10 OCT 2018

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU
PRESENTE.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de agosto, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	agosto 2018.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
10 OCT 2018
HORA: 10:45
RECIBIDO
Atentamente
Por un Chiapas igualitario y plural

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
07 SEP 2018
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
14 SEP 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRIGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CGEIB
RECIBIDO
09 OCT 2018
COORDINACIÓN GENERAL

- C.c.p Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. - Subsecretario de Educación Superior. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación superior Universitaria de la SEP.- Para su conocimiento.
- C.c.p Moisés Robles Cruz.-Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 31 de Agosto de 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J



RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Cargo: Coordinador de Planeación
 Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
 Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Cargo: Coordinador de Planeación
 Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
 Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional	X				\$ 996,798.85	\$ 996,798.85						0	17/09/18	27/12/18	Estamos en espera del traspaso del recurso autorizado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas al INFECH que será la instancia ejecutora del recurso.								
									TOTAL	0	0.00													
									TOTAL	0	0.00													
						\$996,798.85	\$0.00	\$996,798.85																

Mtro. Eulardo Eduardo Molina Hernández
 Titular de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
 Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PREVIA

2



Nombre de la obra: **Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

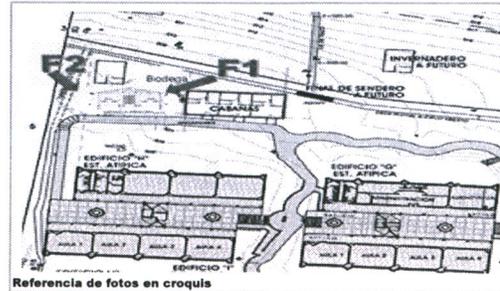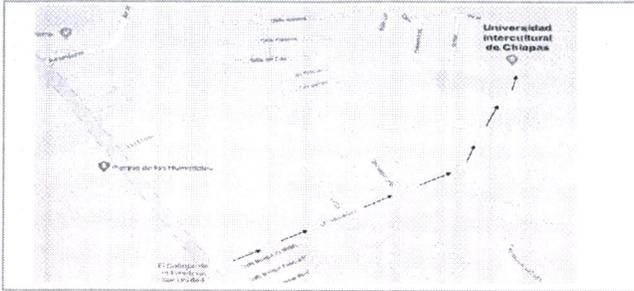


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

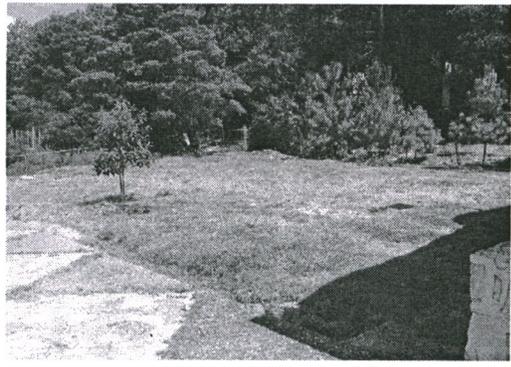


F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:
Se envía fotos del espacio en el cual estara la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Mtro. Baltardo Eduardo Molina Hernández
Titular de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
