



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

UNICH Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

RECIBIDO
2 copias
15 ENE 2019
ash

Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/02/2019
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Jueves 10 de enero de 2019

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO
15 ENE 2019
16:46
OFICINA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO
Copia 1/2

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU
PRESENTE.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de diciembre, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Diciembre 2018.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

15 ENE 2019
13:00
Horas Recibe: M.
Secretaría Técnica
de la Oficina de la C. Secretaría

RECIBIDO PLANTA MAJAJA
Universidad Intercultural de Chiapas

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
15 ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

ATENTAMENTE

Por un Chiapas igualitario y plural

Maria Victoria Mota Gutierrez

RECIBIDO
14 ENE 2019
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

C.P. MARÍA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
15 ENE 2019
13:04
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2 CD's

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. P. 132 y 145

HORA: 9:55
RECIBIDO
Copias de Conocimiento

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Diciembre

FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre de 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 011 07MBU0006J

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Cargo: Coordinador de Planeación
Teléfono: 067 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Cargo: Coordinador de Planeación
Teléfono: 067 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcanza del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Manutención				Proyecto asistencial	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional	X				\$ 900,798.85	\$ 900,798.85	\$ 0.00			100m ²	La empresa constructora comenzó trazando las dimensiones, realizó una nivelación del terreno, colocó planchales de concreto para servir de base del acero, armó columnas, columnas zapatas y se encuentran realizando la construcción para que sirva de sustentación al edificio.	En estos días realizaron espacio de muros y cadenas de desplante para distribuir las cargas verticales y ayudar a la estructura a trabajar correctamente para evitar asentamientos.	30%	24/12/18	04/03/19	A pesar de las inclemencias del tiempo, la empresa constructora está realizando avances en la obra.							
						TOTAL	\$ 900,798.85	\$ 900,798.85	\$ 0.00	TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Rector de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los aspectos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar también como evidencia.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, mes y año.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Diciembre

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


30%

PROYECTO

2

Nombre de la obra: **Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

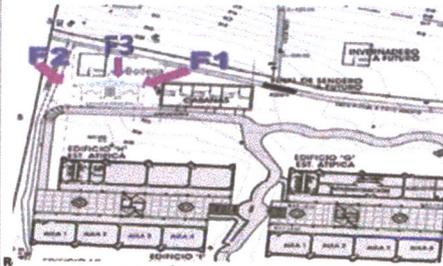

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

La empresa constructora comenzo trazando las dimensiones, realizo una nivelación del terreno, coloco plantillas de concreto, armaron columnas, colaron zapatas y se encuentran realizando la cimentación parca que sirva de sustentación de la construcción.

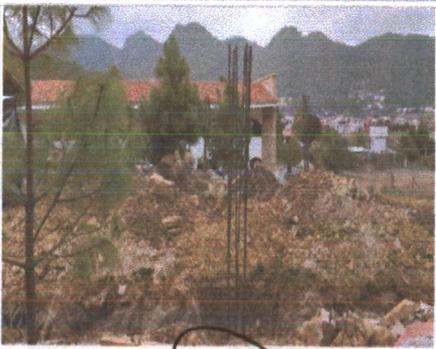

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zúñiga Méndez
Titular de la IES

Mtro. Edgar Ramiro Rodríguez Morales
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
